

Ramo



# TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: DOIUM-R33-2019-AD-071

## DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 69 Y 70 DE LA "LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTO, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO:	
CC-149 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION CERRO COLORADO, EN VARIAS CALLES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION CERRO COLORADO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	
TIPO DE LICITACION:	NUMERO DE CONTRATO:
ADJUDICACION DIRECTA	<u>DOIUM-R33-2019-AD-071</u>
FECHA DE INICIO Y TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	FECHA DE INICIO Y TERMINACION SEGÚN CONVENIO DIFERIMIENTO:
19 DE JULIO 2019 AL 31 DE AGOSTO 2019	07 DE AGOSTO 2019 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2019
FUENTE DE LOS RECURSOS:	DOCUMENTO DE AUTORIZACION O APROBACION:
FONDO III RAMO 33	OFICIO DE APROBACIÓN No. IN-CAB/102/19 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2019
PROGRAMA:	
FISMDF	

*Castillopedraza*  
*FRANCISCA*  
*BM*



**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL  
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**

EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **22 DE NOVIEMBRE DEL 2019**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, LOS RESPONSABLES DE LAS ENTIDADES O SUS REPRESENTANTES, ASÍ COMO EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL MENCIONADO CONTRATO O SU REPRESENTANTE DEBIDAMENTE ACREDITADO, LOS CUALES INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL CUADRO ANTERIOR, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE ESTA ACTA Y SUS ANTEFIRMAS EN CADA UNA DE LAS PAGINAS RESTANTES.

**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:**

**CC-149 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION CERRO COLORADO, EN VARIAS CALLES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION CERRO COLORADO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.**

**A** **TECHO FIRME**

- 1 Suministro e instalación de placa con Nomenclatura alusiva a Dependencias, Obra y Programa Oficial a base de Lámina de PVC de 1/8" plana, gama de colores que indique la supervisión, con grabado en Impresión Directa (según especificaciones y datos del programa) de 29 cms x 13 cms, fijada con 4 tornillos de 3/4", ubicada en lugar visible donde indique la supervisión incluye material, mano de obra e instalación. (Impresión 35 a 69 placas por hoja PVC)
- 2 Desmontaje y/o retiro de techumbre con o sin barrotaje existente, sin recuperación, a base de madera y/o lámina, retiro de material de impermeabilización; retiro de plafón rígido de tablaroca donde aplique. Incluye: conservación y protección de bastidor de barrotaje existente en buenas condiciones y de instalaciones, así como ventanería y loseta, cancelación de salidas de eléctricas, retiro de lámparas, retiro de escombro y madera al sitio de acopio considerando accesos disponibles, limpieza del área de trabajo, maniobras, material, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

*Guiliana Pedraza*

*FRANCISCA*



**TIJUANA**

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: DOIUM-R33-2019-AD-071

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL  
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**

- 3 Construcción de estructura para cubierta a base de bastidor de madera con largueros a cada 60 cm con barrote de pino de 2"x6" y tijerales de madera con barrote de pino 2"x 4" a cada 120 cm. intercalados según diseño. Incluye: Forro de triplay de pino de 5/8" (16mm) (0 caras); Impermeabilización de superficie a base de aplicación de prefabricado "chovateck sbs" granulado blanco 3.5mm. marca thermorock aplicado por termofusión de fuego de soplete de gas butano o propano, sellador asfáltico base agua como tapaporo emulsionado a una sola mano de 4 m<sup>2</sup>/lt diluido con agua limpia en proporción 1:3., incluye: Todos los materiales, acarreo de materiales al sitio de la obra, salidas áreas, chaflanes, cuello de tuberías, bajantes pluviales, preparación de la superficie, todos los suministros de materiales, desperdicios, traslapes, y mano de obra y equipo requeridos para su correcta ejecución.
- 4 Suministro y colocación de Moldura perimetral en techo, tablón 1"x6"x10" madera de pino incluye: acarreo de materiales al sitio de la obra, sellador, pintura esmalte ambas caras a dos manos color que la supervisión indique, cortes, desperdicios, andamios, tornillería, fijación, material, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para su correcta instalación.
- 5 Suministro y colocación de gotero de lámina de 2" donde se indique la supervisión. Incluye: acarreo de materiales al sitio de la obra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
- 6 Suministro y colocación de barrote 2"x6" como refuerzo de estructura en sentido que se requiera o solicite la supervisión. Incluye: acarreo de materiales al sitio de la obra, clavos, tornillos, desperdicio de madera, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
- 7 Suministro y colocación de barrote 2"x4" como refuerzo de estructura en sentido que se requiera o solicite la supervisión. Incluye: acarreo de materiales al sitio de la obra, clavos, tornillos, desperdicio de madera, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
- 8 Suministro y colocación de triplay de pino de 5/8" como protección lateral de cubierta en sentido que se requiera o solicite el supervisor. Incluye: acarreo de materiales al sitio de la obra, clavos, tornillos, o cualquier tipo de fijación que sea necesario, elevaciones, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Cecilia Pedraza

FRANCISCA



**TIJUANA**

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: DOIUM-R33-2019-AD-071

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL  
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**

9 Suministro y colocación de estructura de refuerzo como auxiliar para mejorar la pendiente de techo existente, de altura terminada entre 0.40 y 0.60 cms, a base de 2 barrotos longitudinales de 2"x4"largueros, barrotos diagonales 2"x4"y barrotos verticales 2"x4"@60 cms. Donde lo indique la supervisión. Incluye: acarreo de materiales al sitio de la obra, cortes, maniobras, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

<b>FIANZA DE ANTICIPO:</b>	<b>FIANZA POR CUMPLIMIENTO:</b>
"MAPFRE FIANZAS, S.A DE C.V. No. 0031900006958	"MAPFRE FIANZAS, S.A DE C.V. No. 0031900006959
<b>MONTO TOTAL EJERCIDO C/IVA:</b>	<b>FECHA DE TERMINACION REAL:</b>
\$ 1'049,961.58 M.N.	19 DE SEPTIEMBRE 2019
<b>PAGOS EN ESTIMACIONES:</b>	<b>IMPORTE</b>
ESTIMACION 1	\$ 846,913.96
ESTIMACION 2 FINIQUITO	\$ 203,047.62
	<b>\$ 1'049,961.58 M.N.</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGÚN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, A FIN DE SER RECIBIDOS POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA **NO EXIME** AL CONTRATISTA SOBRE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR EN LOS TRABAJOS REALIZADOS OBJETO DE LA PRESENTE ACTA, PARA LO CUAL, DE SER NECESARIO, SE

*Calixto...*  
*FRANCISCA*  
*[Signature]*



**TIJUANA**

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: DOIUM-R33-2019-AD-071

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL  
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**

RESPONDERA A SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES MEDIANTE LA UTILIZACION DE LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS CON No. 0031900010907 DE MAPFRE FIANZAS S.A. DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019, POR UN MONTO DE \$ 104,996.16 M.N (CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 16/100 M.N).

**ASISTENTES AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION Y FIRMAS:**

ENTREGA  
"LA CONTRATISTA"  
ARQ. ALBERTO AMECA SUAREZ

REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE**  
**"LA CONTRATANTE"**  
DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA  
URBANA MUNICIPAL DEL H. XXIII  
AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.

ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY

**RECIBE**  
SUB-DIRECCION DE OBRA COMUNITARIA  
(RAMO 33).

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON

*Escritura*  
*Francisca*






**TIJUANA**


XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: DOIUM-R33-2019-AD-071


**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL  
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**



<p><b>TESTIGO</b> REPRESENTANTE DEL SINDICO PROCURADOR DE H. XXIII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C</p>  <p><u>ARQ. MARIO RAÚL TAMEZ L.</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p><b>TESTIGO</b> SUPERVISOR TECNICO OBRA COMUNITARIA</p>  <p><u>ARQ. LUZ MIGDALIA ORVE RAMIREZ</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
<p><b>TESTIGO</b> COMITÉ DE OBRA</p>  <p><u>Francisca Gutiérrez Carrillo</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p><b>TESTIGO</b> REPRESENTANTE DE LA DELEGACION CERRO COLORADO</p>  <p><u>Subdelegada</u> NOMBRE Y FIRMA</p>

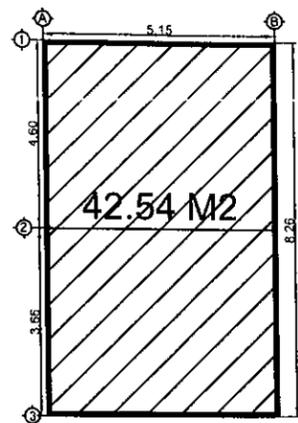


1.- EVANGELISTA RODRIGUEZ FELISE  
CALLE BATALLA DE ACAPULCO #  
S/N COL. MARIANO MATAMOROS  
SUR




2.- PEDRO MEDINA CECILIA  
CALLE KANTUNIL #15358 COLONIA AZTECA  
CEL: 6648567440

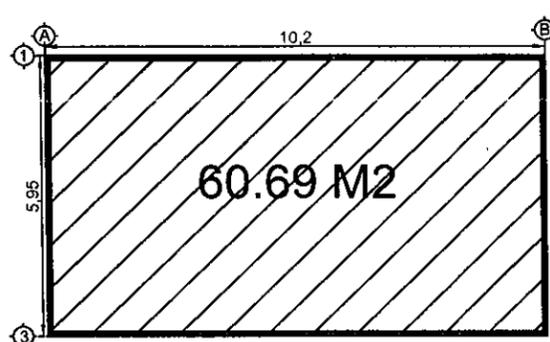


3.- MARIA DEI CARMEN CERDA  
CALLE SONORA #2815 COL. LOMA  
BONITA CEL: 6641622069

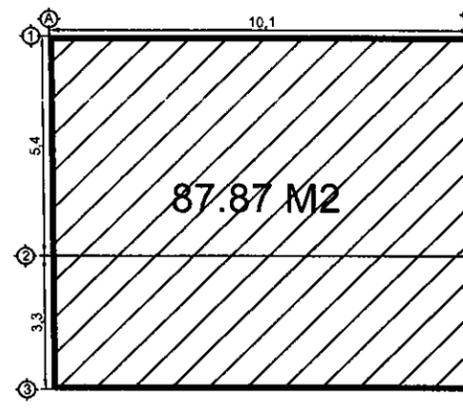


4.- EFREN SANCHEZ DIAZ  
CALLE NUEVA REVOLUCIÓN #20184  
COL. GABRIEL RODRIGUEZ  
CEL: 6641215047




5.- ANA LUISA BOBADILLA BARAJAS  
CALLE LA PURISIMA #2033  
COL. BUENOS AIRES SUR  
CEL: 6642181721

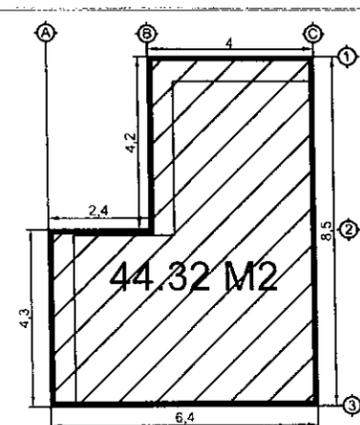


6.- ANA LILIA LUGO MOLINA CALLE  
SATELITE # MZ 109 LT 38 COL.  
HOROSCOPO

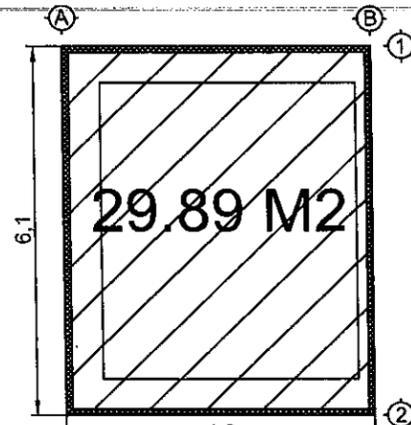


7.- FRANCISCO GUTIERREZ CARRILLO  
CALLE ACUARIO #6 COL. HOROSCOPO  
TEL: 664-546-7659




8.- ROSA TRENE SOLIS  
CALLE PERIMETRAL COL.  
HOROSCOPO TEL: 664-540-0665

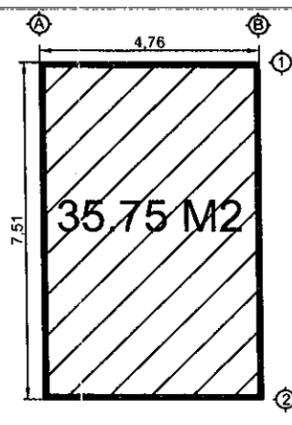


9.- ISABEL VALENZUELA VALENZUELA  
CALLE BATALLA DE ACAPULCO #2018  
COL. MARIANO MATAMOROS SUR  
TEL: 664-759-4238

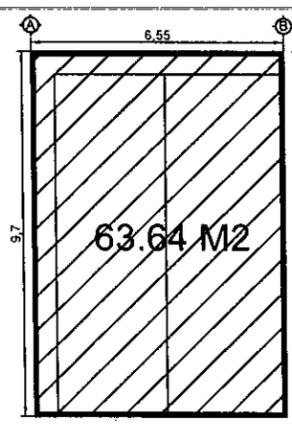


10.- JOSE OCTAVIO ALVARADO TOLEDO  
CALLE SAN JOSE DEL CABO #20428 COL.  
BUENOS AIRES SUR TEL: 664-485-1370

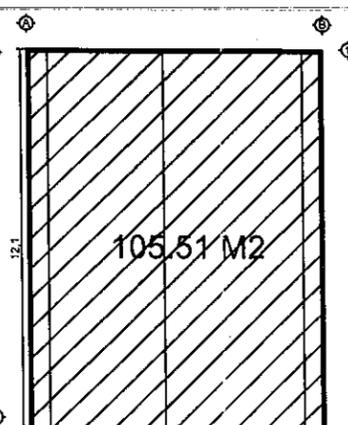


11.- AUDON CONTRERAS VEPES  
CALLE SAN VICENTE #1919 COL. LOMA  
BONITA TEL: 664-234-1944

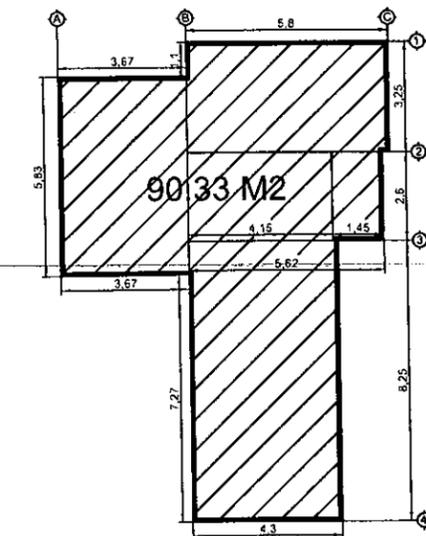


12.- MARIA ASCENCION RIOS REYES  
CALLE EUCALIPTO #2307 COL. PRADERAS  
DE LA MESA TEL: 664-232-8861

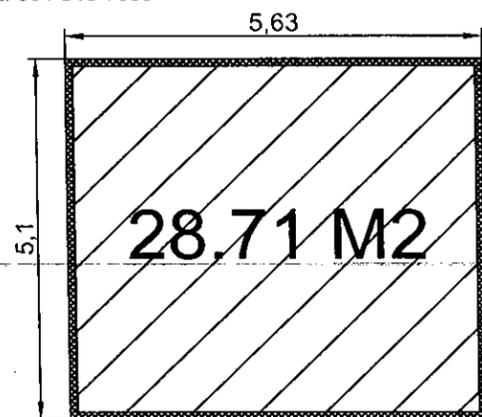

13.- ELIZABETH CASAS CASTILLO  
CALLE LA MESITA COL. CAÑON  
DE LA RAZA

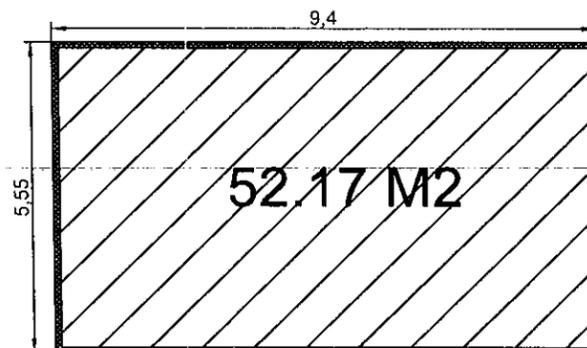

14.- ANTONIO MEJIA GARCIA  
CALLE ACUARIO #10574  
COL. HOROSCOPO

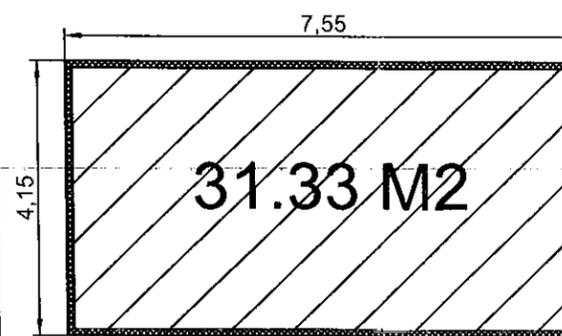

15.- GENOVEVA RODRIGUEZ TOLEDO  
CALLE QUINTANA ROO #8885  
COL. MARIANO MATAMOROS SUR



UBICACIONES VARIAS

PLANO:  
PLANO DE OBRA TERMINADA  
PLANO DE CONJUNTO




CENTENISTA:  
*[Signature]*  
ING. ALBERTO AMECA SUAREZ

CANTIDADES DE OBRA:

N	CONCEPTO	UNID.	CANT.
1	PLACA DE NOMENCLATURA	PZA	13
2	DESMONTAJE V/O RETIRO	M2	836.15
3	CONSTRUCCION	M2	836.15
2	MOLDURA	ML	138.83
2	GOTERO 2"	ML	138.83

SIMBOLOGIA



N. DE OBRA:  
CC-149

NOMBRE DE LA OBRA:  
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN  
VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION CERRO  
COLORADO, EN VARIAS CALLES VARIAS  
COLONIAS DE LA DELEGACION CERRO  
COLORADO, EN LA CIUDAD DE TULANA, B.C.

ESCALA:  
SIN ESCALA  
ACOTAMIENTO:  
METROS

PLANO:  
1 / 1

RESUMEN FINANCIERO FINAL DE OBRA

DATOS GENERALES

CONTRATO: DOIUM-R33-2019-AD-071	No. DE OBRA: CC-149	IMPORTE DE OBRA CONTRATADA: \$ 1,049,961.58	NUMERO DE ESTIMACION : 2 DOS (FINIQUITO)
NOMBRE DE OBRA: CC-149 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO, EN VARIAS CALLES VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.		LUGAR: TIJUANA B.C.	FECHA DE INICIO DE PERIODO: 24 DE AGOSTO DEL 2019
CONTRATISTA: ARQ. ALBERTO AMECA SUAREZ	TERMINACION: 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	PROGRAMA: RAMO XXXIII	FECHA DE TERMINACION DE PERIODO: 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO DEL 2019			FECHA DE ELABORACION DE RESUMEN: 21 DE OCTUBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	PERIODO DEL: 07-AGO-2019 AL 23-AGO-2019			FECHA DE CONVENIO: 28-AGOSTO-2019			PERIODO DEL: 24-AGO-2019 AL 19-SEP-2019			PERIODO DEL: 07-AGO-2019 AL 19-SEP-2019		
						ESTIMACION 1			CONVENIO MODIFICATORIO 1			ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO			RESUMEN FINAL DE OBRA		
						CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
<b>A</b>	<b>TECHO FIRME</b>																
1	Suministro e instalación de placa con Nomenclatura alusiva a Dependencias, Obra y Programa Oficial a base de Lámina de PVC de 1/8" plana, gama de colores que indique la supervisión, con grabado en impresión Directa (Según especificaciones y datos del programa) de 29 cms x 13 cms, fijada con 4 tornillos de 3/4", ubicada en lugar visible donde indique la supervisión incluye material, mano de obra e instalación. (Impresión 35 a 69 placas por hoja PVC).	PZA	28.00	\$ 51.78	\$ 1,449.84	0.00	\$ 51.78	\$ -	15.00	\$ 51.78	\$ 776.70	15.00	\$ 51.78	\$ 776.70	15.00	\$ 51.78	\$ 776.70
2	Desmontaje y/o retiro de techumbre con o sin barrotaje existente, sin ecuperación, a base de madera y/o lámina, retiro de material de impermeabilización; retiro de plafón rígido de tablaroca donde aplique. Incluye: conservación y protección de bastidor de barrotaje existente en buenas condiciones y de instalaciones, así como ventanería y loseta, cancelación de salidas de eléctricas, retiro de lámparas, retiro de escombros y madera al sitio de acopio considerando accesos disponibles, limpieza del área de trabajo, maniobras, material, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	350.00	\$ 55.80	\$ 19,530.00	350.00	\$ 55.80	\$ 19,530.00	856.45	\$ 55.80	\$ 47,789.91	506.45	\$ 55.80	\$ 28,259.91	856.45	\$ 55.80	\$ 47,789.91
3	Construcción de estructura para cubierta a base de bastidor de madera con largueros a cada 60 cm con barrote de pino de 2"x6" y tijerales de madera con barrote de pino 2"x4" a cada 120 cm. Intercalados según diseño. Incluye: Forro de triplay de pino 5/8" (16 mm) (0 caras); Impermeabilización de superficie a base de aplicación de prefabricado "chovateck sbs" granulado blanco 3.5 mm. marca thermorock aplicado por termofusión de fuego de soplete de gas butano o propano, sellador asfáltico base agua como tapaporo emulsionado a una sola mano de 4 m2/lt diluido con agua limpia en proporción 1:3., incluye: Todos los materiales, acarreo de materiales al sitio de la obra, salidas áreas, chafloanes, cuello de tuberías, bajantes pluviales, preparación de la superficie, todos los suministros de materiales, desperdicios, traslapes, y mano de obra y equipo requeridos para su correcta ejecución.	M2	883.00	\$ 818.54	\$ 722,770.82	744.23	\$ 818.54	\$ 609,182.02	856.45	\$ 818.54	\$ 701,038.58	112.22	\$ 818.54	\$ 91,856.56	856.45	\$ 818.54	\$ 701,038.58
4	Suministro y colocación de Moldura perimetral en techo, tablón 1"x6"x10" madera de pino incluye: acarreo de materiales al sitio de la obra, sellador, pintura esmalte ambas caras a dos manos color que la superficie indique, cortes, desperdicios, andamios, tornillería, fijación, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta instalación.	ML	180.00	\$ 142.10	\$ 25,578.00	180.00	\$ 142.10	\$ 25,578.00	458.83	\$ 142.10	\$ 65,199.74	278.83	\$ 142.10	\$ 39,621.74	458.83	\$ 142.10	\$ 65,199.74
5	Suministro de gotero de lamina de 2" donde se indique la supervisión. Incluye: acarreo de materiales al sitio de la obra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	180.00	\$ 50.62	\$ 9,111.60	180.00	\$ 50.62	\$ 9,111.60	458.83	\$ 50.62	\$ 23,225.98	278.83	\$ 50.62	\$ 14,114.37	458.83	\$ 50.62	\$ 23,225.98
6	Suministro y colocación de barrote 2"x6" como refuerzo de estructura en sentido que se requiera o solicite la supervisión. Incluye: acarreo de materiales al sitio de la obra, clavos, tornillos, desperdicio de madera, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	368.00	\$ 107.75	\$ 39,652.00	222.26	\$ 107.75	\$ 23,948.52	226.08	\$ 107.75	\$ 24,360.29	3.8216	\$ 107.75	\$ 411.78	226.08	\$ 107.75	\$ 24,360.29
7	Suministro y colocación de barrote 2"x4" como refuerzo de estructura en sentido que se requiera o solicite la supervisión. Incluye: acarreo de materiales al sitio de la obra, clavos, tornillos, desperdicio de madera, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	324.00	\$ 114.16	\$ 36,987.84	165.10	\$ 114.16	\$ 18,847.82	165.10	\$ 114.16	\$ 18,847.82	0.00	\$ 114.16	\$ -	165.10	\$ 114.16	\$ 18,847.82
8	Suministro y colocación de triplay de pino de 5/8" como protección lateral de cubierta en sentido que se requiera o solicite el supervisor. Incluye: acarreo de materiales al sitio de la obra, clavos, tornillos, desperdicio de madera, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	155.00	\$ 249.37	\$ 38,652.35	50.10	\$ 249.37	\$ 12,493.44	50.10	\$ 249.37	\$ 12,493.44	0.00	\$ 249.37	\$ -	50.10	\$ 249.37	\$ 12,493.44
9	Suministro y colocación de estructura de refuerzo como auxiliar para mejorar la pendiente de techo existente, de altura terminada entre 0.40 y 0.60 cms, a base de 2 barroses longitudinales de 2"x4" largueros, barroses diagonales 2"x4" y barroses verticales de 2"x4" @ 60 cms. Incluye: acarreo de materiales al sitio de la obra, cortes, maniobras, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	38.00	\$ 300.18	\$ 11,406.84	38.00	\$ 300.18	\$ 11,406.84	38.00	\$ 300.18	\$ 11,406.84	0.00	\$ 300.18	\$ -	38.00	\$ 300.18	\$ 11,406.84
					<b>SUBTOTAL</b>	\$ 905,139.29	<b>SUBTOTAL</b>	\$ 730,098.24	<b>SUBTOTAL</b>	\$ 905,139.29	<b>SUBTOTAL</b>	\$ 175,041.05	<b>SUBTOTAL</b>	\$ 905,139.29			
					<b>L.V.A.</b>	\$ 144,822.29	<b>L.V.A.</b>	\$ 116,815.72	<b>L.V.A.</b>	\$ 144,822.29	<b>L.V.A.</b>	\$ 28,006.57	<b>L.V.A.</b>	\$ 144,822.29			
					<b>TOTAL</b>	\$ 1,049,961.58	<b>TOTAL</b>	\$ 846,913.96	<b>TOTAL</b>	\$ 1,049,961.58	<b>TOTAL</b>	\$ 203,047.62	<b>TOTAL</b>	\$ 1,049,961.58			


EJERCICIO DEL CONTRATO (CON I.V.A.)	
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO	\$ 1,049,961.58
AMPLIACIONES AUTORIZADAS CONVENIO MODIFICATORIO 1	\$ 95,115.38
REDUCCIONES AUTORIZADAS CONVENIO MODIFICATORIO 1	\$ 95,115.38
IMPORTE FINAL DEL CONTRATO CONVENIO MODIFICATORIO No. 1	\$ 1,049,961.58
ANTICIPO DE LA OBRA	\$ 314,988.47
SALDO SIN EJERCER	\$ -


EJERCIDO	\$ 846,913.96
TOTAL EJERCIDO	\$ 846,913.96
POR EJERCER	\$ 203,047.62
AMORTIZADO	\$ 254,074.19
TOTAL AMORTIZADO	\$ 254,074.19
POR AMORTIZAR	\$ 60,942.28
AVANCE	80.66%

EJERCIDO	\$ 203,047.62
TOTAL EJERCIDO	\$ 1,049,961.58
POR EJERCER	\$ -
AMORTIZADO	\$ 60,914.29
TOTAL AMORTIZADO	\$ 314,988.47
POR AMORTIZAR	\$ -
AVANCE	100.00%

EJERCIDO	\$ 1,049,961.58
TOTAL EJERCIDO	\$ 1,049,961.58
POR EJERCER	\$ -
AMORTIZADO	\$ 314,988.47
TOTAL AMORTIZADO	\$ 314,988.47
POR AMORTIZAR	\$ -
AVANCE FINAL	100.00%

Por la Contratista  
  
ARQ. ALBERTO AMECA SUAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

VALIDO  
  
ARQ. LUZ MIGDALIA ORVE RAMIREZ  
SUPERVISOR DE OBRA COMUNITARIA

Vo. Bo.  
  
ARQ. HECTOR CORTES SERRANO  
JEFE DEL DEPTO. OPERATIVO DE LA SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA

Vo. Bo.  
  
ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON  
SUBDIRECTOR DE OBRA COMUNITARIA

AUTOREA  
  
ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY  
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

<b>VIGENCIA DEL:</b>	19/09/2019	<b>AL:</b>	18/09/2020	<b>MOVIMIENTO:</b>	0	<b>MONTO:</b>	104,996.16
<b>FIADO:</b>	AMECA SUAREZ, ALBERTO			<b>R.F.C.:</b>	AESAS50804S71		
<b>MOVIMIENTO:</b>	EMISION						
<b>MONEDA:</b>	PESOS						
<b>RAMO:</b>	ADMINISTRATIVAS						
<b>SUBRAMO/NOMBRE:</b>	Obra / Buena Calidad Obra						
<b>DIVISIÓN:</b>	OPERACION BAJA CALIFORNIA			<b>CLAVE:</b>	61157		
<b>AGENTE:</b>	PRAXIS AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS S.A. DE C.V.						
				<b>PRIMA</b>			0.00
				<b>D.I.V.</b>			0.00
				<b>GASTOS DE EXPEDICIÓN</b>			0.00
				<b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN</b>			0.00
				<b>GASTOS DE AFECTACIÓN</b>			0.00
				<b>SUBTOTAL</b>			0.00
				<b>I.V.A. 16%</b>			0.00
				<b>PRIMA TOTAL</b>			0.00

MAPFRE FIANZAS S. A. en el ejercicio de la autorización que le fue otorgada por la S.H.C.P. y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta por la suma de:

**MXP 104,996.16 (-CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.-)**

ANTE: AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C. CON DOMICILIO EN AVE. INDEPENDENCIA No. 1350, ZONA URBANA RIO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, C.P. 22010

PARA GARANTIZAR POR ALBERTO AMECA SUAREZ, CON DOMICILIO EN CALLE DIAMANTE NUMERO 321, FRACC. LA JOYA, TIJUANA B.C., C.P. 22640 Y CON R.F.C. AESAS50804S71, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN Y/O VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRIERA, EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. DOJUM-R33-2019-AD-071 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2019, CON UN IMPORTE TOTAL EJERCIDO DE \$1,049,961.58 M.N. (UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 58/100 MONEDA NACIONAL) I.V.A. INCLUIDO, RELATIVO A: CC-149 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION DE CERRO COLORADO, EN VARIAS CALLES VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION CERRO COLORADO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C., CUYO CONTENIDO Y ANEXOS SON DEL PLENO CONOCIMIENTO DE ESTA INSTITUCION AFIANZADORA.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SE CONSTITUYE POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$104,996.16 M.N. (CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS SIETE PESOS 16/100 MONEDA NACIONAL), PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO EN LA REALIZACION DE LOS MISMOS. ESTA FIANZA TENDRA UNA DURACION DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA SU CANCELACION SE REQUIERE LA AUTORIZACION EXPRESA DEL BENEFICIARIO. EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA INSTITUCION AFIANZADORA SE SOMETE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y ESTA CONFORME EN QUE SE APLIQUE DICHO PROCEDIMIENTO CON EXCLUSION DE CUALQUIER OTRO Y AL EFECTO MAPFRE FIANZAS, S.A., PAGARA EN TERMINOS DE LEY. MAPFRE FIANZAS, S.A., SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 178 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR. MAPFRE FIANZAS, S.A., DECLARA QUE TIENE SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACION EN DR. ATL 1-501, ZONA URBANA RIO TIJUANA, C.P. 22010, TIJUANA, B.C. \*\*FIN DE TEXTO\*\*

- OBJETO: GARANTIZAR LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL FIADO.
- FIADO: ALBERTO AMECA SUAREZ
- DOMICILIO FIADO: DIAMANTE 315 FRACC. LA JOYA, C.P. 22645, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE.
- BENEFICIARIO: AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.
- DOMICILIO BENEFICIARIO: AVE. INDEPENDENCIA NO. 1350 ZONA URBANA RIO, C.P. 22010, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE.



CARLOS RENE GONZALEZ MAYER  
DIRECTOR DE FIANZAS

**SELLO DIGITAL:** qxzyIQIVMfQU3iBi5cUduReuV9BRL7sd+YRy+rFLdA8emMvpKjJa32cZIXHT7DP2XRIKuAZa5KDFG9QLk8UeN2ooWdY9Cs/Zu7nu0wKNZsPC1A5z4Ec4ut8SNMoD3ZW0KFbkqLaUIWyoQbH2Zh1Ay3aR20IbMZdWXC5U1TvPooe2vcd14GLXNMOKZZJLP4MmePOLPudCux04rojeloXINAzMJZQaHwOwVj6LH1DirvC6IDR/D5tfgvgeba7n/I3JyYxrbUWxSdM3POvdYPN6iPhdxcxtgkXnC1czZWaaVd/5JcnoUE+OMUUZ3zgdAD9JHamMFYR9IMbCiOiYIA==

México, Ciudad de México a 19 de septiembre de 2019

NORMAS REGULADORAS EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS

ESTA FIANZA ES NULA Y SIN NINGÚN VALOR SI SE EXPIDE PARA GARANTIZAR OPERACIONES DE CRÉDITO AÚN Y CUANDO EL TEXTO DE LA MISMA DIGA LO CONTRARIO.


FIANZA: 0031900010907

LÍNEA VAL: 0031900010907319107498152

ENDOSO: 0

**ESTE FOLIO ES ÚNICAMENTE VÁLIDO COMO COMPLEMENTO DE TEXTO DE LA FIANZA QUE SE INDICA EN LA PARTE SUPERIOR**

- FORMA DE ACREDITAR EL INCUMPLIMIENTO: EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES



CARLOS RENE GONZALEZ MAYER  
DIRECTOR DE FIANZAS

SELLO DIGITAL: qxzyIQlVMfQU3iBI5cUduReuV9BRL7sd+YRy+rFLdA8emMvpKjJa32cZIXHT7DP2XRIKuAZa5KDFG9QLk8UeN2ooWdY9Cs/Zu7nu0w  
kNZsPC1A5z4Ec4ut8SNMoD3ZW0KFBkqLaUIWyOqBh2Zh1Ay3aR20IbMZdWXC5U1TvPoeo2vcd14GLXNMOKZZJJLP4MtmePOLP  
udCux04rojeioXiNAzmJZQaHW0wVj6LH1DirvC8IDR/D5ifgvgeba7n/i3JyYxrbUWvXsdM3POvdYPN6iPhdxcxgkXnC1czZWaaWd/5Jc  
noUE+OMUJZ3zgdAD9JHamMFYR9iMbCiOiYIA==

México, Ciudad de México a 19 de septiembre de 2019

NORMAS REGULADORAS EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS

ESTA FIANZA ES NULA Y SIN NINGÚN VALOR SI SE EXPIDE PARA GARANTIZAR OPERACIONES DE CRÉDITO AÚN Y CUANDO EL TEXTO DE LA MISMA DIGA LO CONTRARIO.

Línea de Validación

0031900010907319107496

Validar Fianza Impresa

Folio de Validación

1090719092019346412

## Información de la Fianza

Fianza: 0031900010907

Fiado: ALBERTO AMECA SUAREZ

Beneficiario: AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.

Monto Afianzado del Endoso: 104,996.16

Estatus de Endoso: VIGENTE

Monto Total de Póliza: 104,996.16

Estatus de Póliza: VIGENTE

Moneda: PESOS

Vigencia

Inicio: 19/09/2019

Fin: 18/09/2020

Subramo: Obra

Con gusto atendemos sus comentarios en la siguiente dirección  
de correo electrónico: [fianza\\_factura@mapfre.com.mx](mailto:fianza_factura@mapfre.com.mx)

MAPFRE © 2010.

[Aviso Legal](#)

**ACTA DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS TERMINADOS  
DEL CONTRATO DOIUM-R33-2019-AD-071**

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS TERMINADOS DEL CONTRATO DOIUM-R33-2019-AD-071, SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. Y LA CONTRATISTA ARQ. ALBERTO AMECA SUÁREZ, REPRESENTADA POR EL ARQ. ALBERTO AMECA SUÁREZ.


EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C. SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2019, EN CUMPLIMIENTO A LOS ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 69 Y 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS A LA OBRA "CC-149 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO, EN VARIAS CALLES VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.", COMPARECEN EN REPRESENTACIÓN EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS EL ARQ. HECTOR COSTES SERRANO, JEFE DEL DEPTO. OPERATIVO DE LA SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA, LA ARQ. ALBERTO AMECA SUAREZ, SUPERVISOR DE TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA Y POR OTRA PARTE EL ARQ. ALBERTO AMECA SUÁREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE ARQ. ALBERTO AMECA SUÁREZ PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA EN LA QUE SE LLEVARA A CABO EL ACTA DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, DE LA OBRA DENOMINADA "CC-149 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO, EN VARIAS CALLES VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.", EFECTUADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DOIUM-R33-2019-AD-071, EJECUTADOS POR EL ARQ. ALBERTO AMECA SUAREZ.

## ACTA DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS TERMINADOS DEL CONTRATO DOIUM-R33-2019-AD-071

### DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE VERIFICAN:

- SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA CON NOMECLATURA ALUSIVA A DEPENDENCIAS, OBRA Y PROGRAMA OFICIAL A BASE DE LAMINA DE PVC.
- DESMONTAJE Y/O RETIRO DE TECHUMBRE CON O SIN BARROTAJE EXISTENTE, SIN RECUPERACION, A BASE DE MADERA Y/O LAMINA, RETIRO DE MATERIAL DE IMPERMEABILIZACION, RETIRO DE PLAFON RIGIDO DE TABLAROCA DONDE APLIQUE.
- CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA CON LARGUEROS A CADA 60 CM CON BARROTE DE PINO DE 2" X6" Y TIJERALES DE MADERA CON BARROTE DE PINO 2"X4" A CADA 120CM INTERCALADOS SEGÚN DISEÑO.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA PERIMETRAL EN EL TECHO, TABLON 1"X6X10" MADERA DE PINO.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE GOTERO DE LAMINA DE 2" DONDE SE INDIQUE LA SUPERVISION.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARROTE 2"X4" COMO REFUERZO DE ESTRUCTURA EN SENTIDO QUE SE REQUIERA O SOLICITE LA SUPERVISION.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARROTE 2"X6" COMO REFUERZO DE ESTRUCTURA EN SENTIDO QUE SE REQUIERA O SOLICITE LA SUPERVISION.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARROTE 4"X4" COMO REFUERZO DE ESTRUCTURA EN SENTIDO QUE SE REQUIERA O SOLICITE LA SUPERVISION.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRIPLAY DE PINO DE 5/8" COMO PROTECCION LATERAL DE CUBIERTA EN SENTIDO QUE SE REQUIERA O SOLICITE EL SUPERVISOR.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE REFUERZO COMO AUXILIAR PARA MEJORAR LA PENDIENTE DE TECHO EXISTENTE.



**ACTA DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS TERMINADOS  
DEL CONTRATO DOIUM-R33-2019-AD-071**

**OBSERVACIONES:** LOS TRABAJOS CONTRATADOS HAN SIDO CONCLUIDOS AL 100% DE ACUERDO A VOLUMENES DE CONTRATO, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO A LA FECHA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD.


PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN, AL 03 DE OCTUBRE DEL 2019.

LA CONTRATISTA




ARQ. ALBERTO AMECA SUAREZ

POR PARTE DE SUBDIRECCION DE OBRA  
COMUNITARIA.




ARQ. HECTOR CORTES SERRANO  
JEFE DEL DEPTO. DE LA SUBDIRECCIÓN  
DE OBRA COMUNITARIA

POR PARTE DE SUBDIRECCION DE OBRA  
COMUNITARIA.




ARQ. LUZ MIGDALIA ORVE RAMIREZ  
SUPERVISOR TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN  
DE OBRA COMUNITARIA

CC-149 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION CERRO COLORADO, EN VARIAS CALLES VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION CERRO COLORADO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C. DOIUM-R33-2019-AD-071

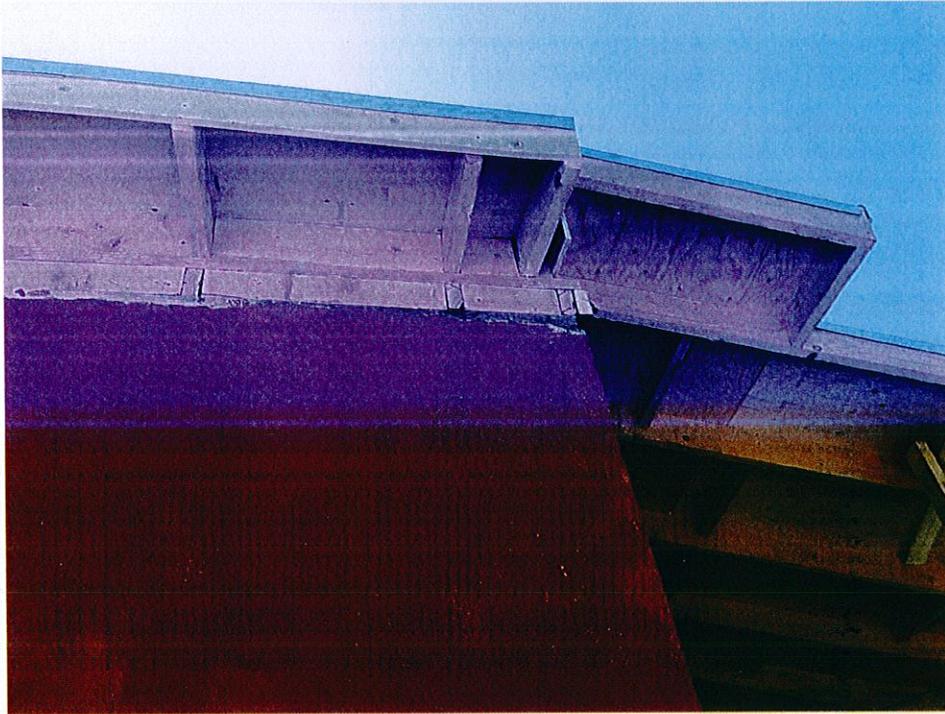


Vertical text on the left margin, possibly a page number or reference code, appearing as "149".

**CC-149 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION CERRO COLORADO, EN VARIAS CALLES VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION CERRO COLORADO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C. DOIUM-R33-2019-AD-071**

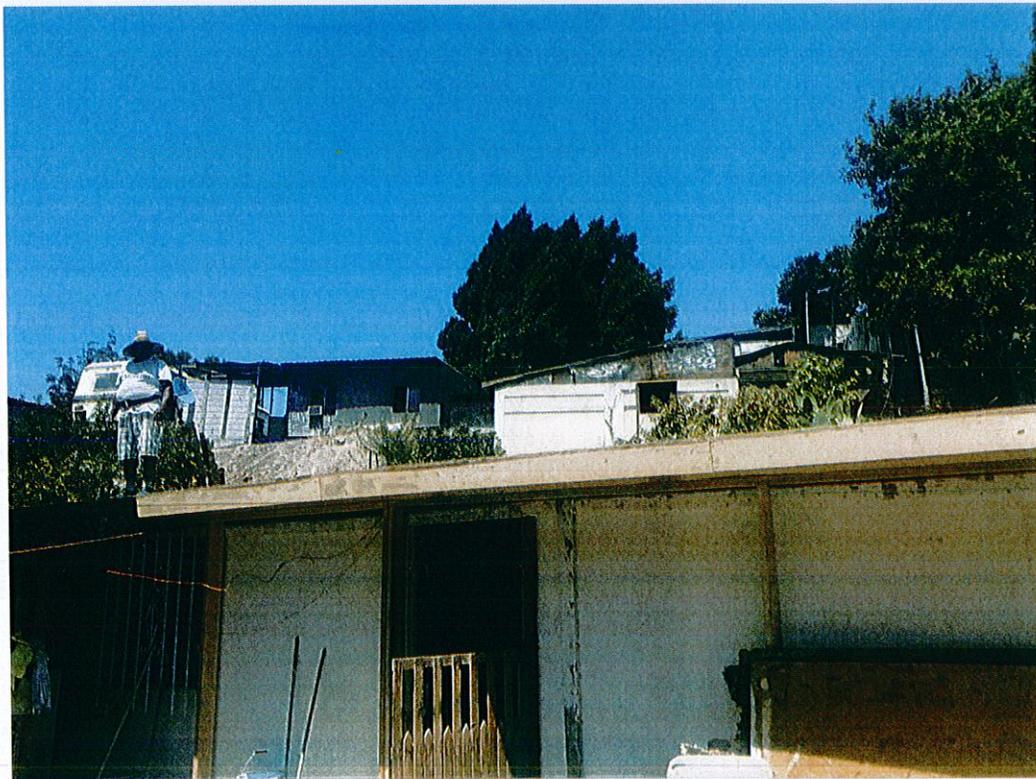

CC-149 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION CERRO COLORADO, EN VARIAS CALLES VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION CERRO COLORADO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C. DOIUM-R33-2019-AD-071

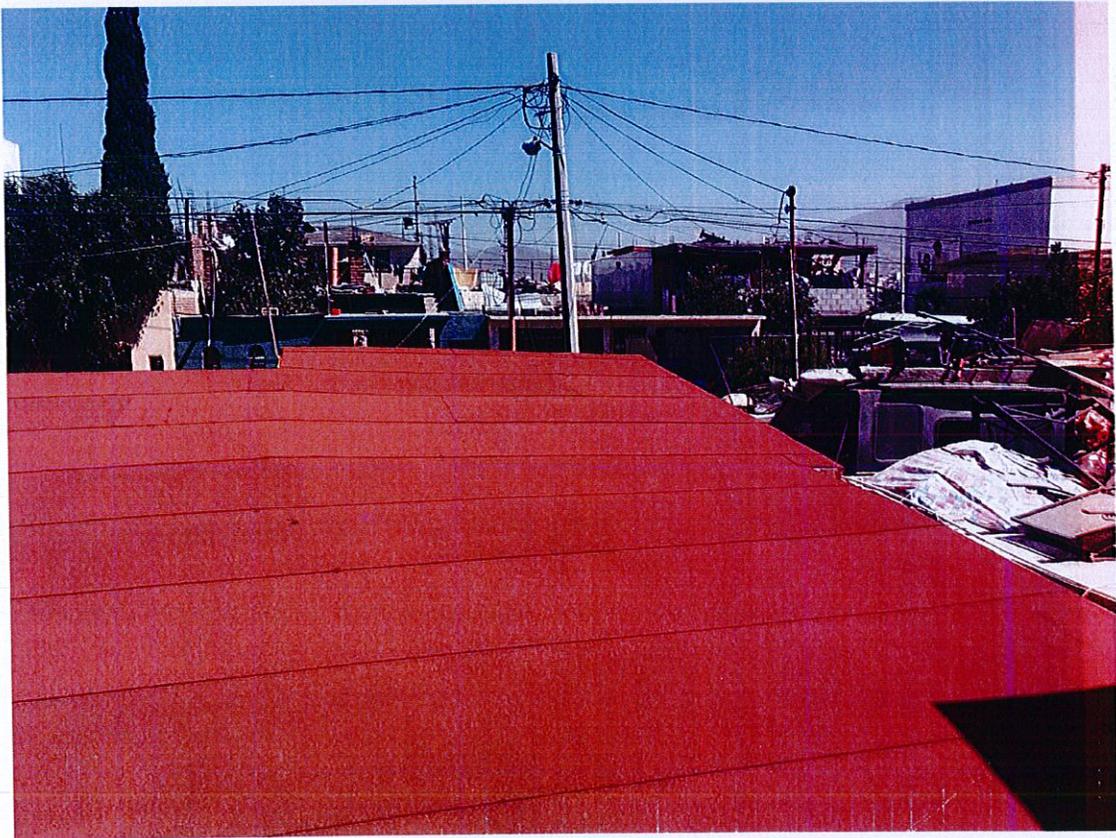

*[Handwritten signature]*



**TIJUANA**

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

Dependencia: D.O.I.U.M.

Sección: Subdirección de obra comunitaria

Número de Oficio: SOC-XXIII-0309-2019

Expediente: N/A

Asunto: Invitación para acta de entrega-recepción.

Tijuana, Baja California a 14 de noviembre de 2019

**ARQ. ALBERTO AMECA SUAREZ**  
CALLE DIAMANTE No. 315, FRACC. LA JOYA  
TIJUANA, B.C.  
**PRESENTE**

Por este medio reciba un cordial saludo, y al mismo tiempo me permito informarle que con fecha **Viernes 22 de Noviembre del 2019** en el horario que se indica, se llevará a cabo el Acto de Entrega-Recepción respecto de los trabajos denominados:


No. DE CONTRATO	DESCRIPCION DE OBRA	HORA
DOIUM-R33-2019-AD-071	"CC-149 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO, EN VARIAS CALLES VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C."	10:00 HRS

Lo anterior se hace de su conocimiento con el fin de que designe al personal a efecto de que haga acto de presencia al mismo en cumplimiento al artículo 69, el punto de reunión será en la Subdelegación Insurgentes.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva prestar a la presente, me despido quedando en espera de su amable respuesta y a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**  
**SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA**

**JOSE MANUEL QUINTANA ROBON**



C.c.p. Mdu. Arq. Patricia Peterson Villalobos. - Secretaría De Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental del Ayuntamiento De Tijuana  
C.c.p. Arq. Javier Delgado Garibay - Dirección de Obra e Infraestructura Urbana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana.  
C.c.p. - Archivo Dirección  
Expediente. JDG/JMR/BSFR



(664) 973-7000 @tijuana.gob.mx

Avenida Independencia 1350, Zona Urbana Río, C. P. 22010 Tijuana, Baja California, México
