



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: DOIUM-R33-2019-AD-062

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 69 Y 70 DE LA "LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTO, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO:

SLG-092 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES, COLONIA AMPLIACION EJIDO LAZARO CARDENAS, DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.

TIPO DE LICITACION:

ADJUDICACION DIRECTA

NUMERO DE CONTRATO:

DOIUM-R33-2019-AD-062

FECHA DE INICIO Y TERMINACION SEGÚN CONTRATO:

12 DE JUNIO 2019 AL 20 DE AGOSTO 2019

FECHA DE INICIO Y TERMINACION SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO 1:

12 DE JUNIO 2019 AL 20 DE AGOSTO 2019

FUENTE DE LOS RECURSOS:

FONDO III RAMO 33

DOCUMENTO DE AUTORIZACION O APROBACION:

OFICIO DE APROBACIÓN No. IN-CAB/102/19
DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2019

PROGRAMA:

FISMDF



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: DOIUM-R33-2019-AD-062

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, LOS RESPONSABLES DE LAS ENTIDADES O SUS REPRESENTANTES, ASÍ COMO EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL MENCIONADO CONTRATO O SU REPRESENTANTE DEBIDAMENTE ACREDITADO, LOS CUALES INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL CUADRO ANTERIOR, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE ESTA ACTA Y SUS ANTEFIRMAS EN CADA UNA DE LAS PAGINAS RESTANTES.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

SLG-092 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES, COLONIA AMPLIACION EJIDO LAZARO CARDENAS, DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.

A

TRAMITOLOGIA

1

2.- PAGO DE LA APROBACION, SUPERVISION Y MANO DE OBRA POR CONEXION DEL PROYECTO, MEDIANTE OFICIO RESOLUTORIO DE COMUN ACUERDO DEL MONTO ESTIPULADO POR CFE., ENTREGAR LA DOCUMENTACION REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION DE CFE DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DEL INSTRUCTIVO POR TERCEROS CONSTRUCTORES DE INSTALACIONES DE RED SISTEMA AEREO PARA ENTREGA DE OBRAS PARA SU PROPIEDAD Y OPERACION DE LA MISMA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. REQUISITOS DE ENTREGA 1.- AVISO DE INICIO DE OBRA. 2.- CONVENIO DE OBRA. 3.- SOLICITUD DE PLACAS PARA ENUMERAR POSTERIA. 4.- SOLICITUD DE NUMEROS ECONOMICOS DE BANCOS DE TRANSFORMACION. 5.- ACTA DE ENTREGA DE LAS INSTALACIONES A CFE. 6.- INVENTARIO FISICO VALORIZADO DE LA OBRA. 7.- ENTREGA DE FACTURAS DE LOS MATERIALES. 8.- LISTADO DE MATERIALES PROTOCOLIZADOS Y TRANSFERIDOS MEDIANTE CLAVE DE COMPRA A CFE EN (SIGLA 3). 9.- ENTREGA DE OFICIO DE PAGO DE SUTERM PARA AUTORIZACION DE CONEXION DE LA OBRA. 10.- ENTREGA CARTA RESPONSIVA O FIANZA DE GARANTIA POR UN AÑO A FAVOR DE CFE POR CUALQUIER DESPERFECTO QUE SE PUDIERA PRESENTA EN LA OBRA. 11.- ENTREGA DEL PROYECTO IMPRESO EN 90X60 DE OBRA TERMINADA GEORREFERENCIADO CON LA RED NACIONAL DE CFE. 12.- ENTREGA DE PROYECTO DIGITALIZADO GEORREFERENCIADO EN 90X60 A CFE. 13.- SOLICITAR NÚMERO DE MEMO CON FECHA DE CONEXION DE LA OBRA EN DPTO DE CONSTRUCCION. 14.- ENTREGA DE MATERIAL A CFE PARA LA CONEXION DE LA OBRA. 15.- LISTADO DE LOS USUARIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO ELECTRICO PARA SU CONTRATACION ANTE C,F,E,-----



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: DOIUM-R33-2019-AD-062

DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

- | B | ESTRUCTURAS |
|----|---|
| 2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS. 750 TIPO COSTA DONDE SE REQUIERA SE PODRA COLOCAR POSTE DE MADERA 40' Y/O 30' TRATADO CLASE 3 SEGÚN NORMA DE CFE, INCLUYE LEVANTAMIENTO Y TRAZO PARA SEMBRADO. NOTA: EL POSTE DE MADERA EN MENCIÓN SE COLOCARA A MANIOBRA, ESTO POR TENER EL PUNTO DE COLOCACION DEL POSTE DE ACUERDO AL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA, EN TERRENO MUY ACCIDENTADO Y QUE NO SE PUEDA ACCIONAR EL EQUIPO DE GRUA PARA SU ANCLAMIENTO DEL POSTE DE CONCRETO. |
| 3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 09 MTS. 400 TIPO COSTA DONDE SE REQUIERA SE PODRA COLOCAR POSTE DE MADERA 30' TRATADO CLASE 2 SEGÚN NORMA DE CFE, INCLUYE LEVANTAMIENTO Y TRAZO PARA SEMBRADO. NOTA: EL POSTE DE MADERA EN MENCIÓN SE COLOCARA A MANIOBRA, ESTO POR TENER EL PUNTO DE COLOCACION DEL POSTE DE ACUERDO AL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA, EN TERRENO MUY ACCIDENTADO Y QUE NO SE PUEDA ACCIONAR EL EQUIPO DE GRUA PARA SU ANCLAMIENTO DEL POSTE DE CONCRETO. |
| 4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA AD20-2F CON CRUCETA DE MADERA CRESOTADA TIPO COSTA L8/200 -PARA CONCRETO |
| 5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA RD20-2F CON CRUCETA DE MADERA CRESOTADA TIPO COSTA L8/200 -PARA CONCRETO |
| 6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA TS20, CON CRUCETA DE MADERA CRESOTADA TIPO COSTA L8/200 -PARA CONCRETO |
| 7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA 2T20-2F CON CRUCETA DE MADERA CRESOTADA TIPO COSTA L8/200 -PARA CONCRETO |
| 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION 4BPR-(1/0-1/0-1/0) COBRE PARA PARA CONCRETO |
| 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDAS RSA PARA CONCRETO |
| 12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDAS RDA PARA CONCRETO |
| 13 | SUMINISTRO COLOCACION DE SISTEMAS DE TIERRA PARA APARTARRAYOS Y TRANSFORMADORES CON ALAMBRE DE Cu. CAL 4 PARA CONCRETO |



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: DOIUM-R33-2019-AD-062

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

- 14 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE TRANSFORMACION DE 37.50KVA 13200/120/240 NORMA C.F.E. TIPO COSTA PARA CONCRETO INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION-CRUCETA-PT200, CUCHILLAS PORTA FUSIBLE, APARTARRAYOS, MENZULAS, CONECTORES LINEA VIVA, ALAMBRE DE COBRE DEL 4 PARA ATERRIZAR CARCASA Y APARTARRAYOS.

C CONDUCTORES

- 15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR PRIMARIO CABLE DESNUDO ACSR AL. AW 1/0 TIPO COSTA
- 16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CONDUCTOR 2+1 3/0 AW TIPO NEUTRANEL PARA SECUNDARIO

D COMPLEMENTOS

- 17 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLEROS 120 VOLTIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA LA CONEXIÓN DEL SERVICIO A BENEFICIADOS CON EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION.

EXT EXTRAORDINARIOS

- EXT-01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDAS RDB PARA CONCRETO
- EXT-02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE TRANSFORMACION DE 50KVA 13200/120/240 NORMA C.F.E. TIPO COSTA PARA CONCRETO INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION-CRUCETA-PT200, CUCHILLAS PORTA FUSIBLE, APARTARRAYOS, MENZULAS, CONECTORES LINEA VIVA, ALAMBRE DE COBRE CAL. 4 PARA ATERRIZAR CARCASA Y APARTARRAYOS.
- EXT-03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJAS SISTEMA ANTIFRAUDE TIPO PS.- RR.- TF.-SITRONIC NORMA CON ESPECIFICACION CFE
- EXT-04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED TIPO AUTOBAHN ATBS-E-MVD2-120/277-377-240- INCLUYE FOTOCELDA P/ LUMINARIA LED CAT-DLL127ELECT.V0L. MARCA AEL/AMERICAN ELECTRIC LIGTING, CON TODO PARA SU FIJACION.
- EXT-05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDAS RPP PARA CONCRETO
- EXT-06 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO METALICO GALVANIZADO DE 2.40 MTS. DE LARGO POR 2" DE DIAMETRO CED-30, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.
- EXT-07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DUPLEX UF 2X12, DE POSTE HASTA LA LAMPARA, INCLUYE: CONEXIONES Y PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: DOIUM-R33-2019-AD-062

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

ASISTENTES AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION Y FIRMAS:

ENTREGA
"LA CONTRATISTA"
C. PEDRO RIVERA GALEAS

REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE
"LA CONTRATANTE"
DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
URBANA MUNICIPAL DEL H. XXIII
AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.

ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY

RECIBE
SUB-DIRECCION DE OBRA COMUNITARIA
(RAMO 33).

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: DOIUM-R33-2019-AD-062

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

FIANZA DE ANTICIPO:	FIANZA POR CUMPLIMIENTO:										
"SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A DE C.V. No. 2324044	"SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A DE C.V. No. 2324045										
MONTO TOTAL EJERCIDO C/IVA:	FECHA DE TERMINACION REAL:										
\$ 1'342,365.25 M.N.	20 DE AGOSTO 2019										
<table><thead><tr><th>PAGOS EN ESTIMACIONES:</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>ESTIMACION 1</td><td>\$ 652,773.73</td></tr><tr><td>ESTIMACION 2 FINIQUITO</td><td>\$ 689,591.52</td></tr><tr><td></td><td> </td></tr><tr><td></td><td>\$ 1'342,365.25 M.N.</td></tr></tbody></table>		PAGOS EN ESTIMACIONES:	IMPORTE	ESTIMACION 1	\$ 652,773.73	ESTIMACION 2 FINIQUITO	\$ 689,591.52				\$ 1'342,365.25 M.N.
PAGOS EN ESTIMACIONES:	IMPORTE										
ESTIMACION 1	\$ 652,773.73										
ESTIMACION 2 FINIQUITO	\$ 689,591.52										
	\$ 1'342,365.25 M.N.										

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGÚN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, A FIN DE SER RECIBIDOS POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA **NO EXIME** AL CONTRATISTA SOBRE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR EN LOS TRABAJOS REALIZADOS OBJETO DE LA PRESENTE ACTA, PARA LO CUAL, DE SER NECESARIO, SE RESPONDERA A SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES MEDIANTE LA UTILIZACION DE LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS CON No. 2376387 DE **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.** DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, POR UN MONTO DE \$ 134,236.52 M.N (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 52/100 M.N).

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: DOIUM-R33-2019-AD-062

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

TESTIGO REPRESENTANTE DEL SINDICO PROCURADOR DE H. XXIII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C <u>ARQ. MARICEL PAUL TAMEZ</u> NOMBRE Y FIRMA	TESTIGO SUPERVISOR TECNICO OBRA COMUNITARIA <u>ARQ. CARLOS HANS CHRISTLIEB ESPARZA</u> NOMBRE Y FIRMA
TESTIGO COMITÉ DE OBRA <u>Emmanuel Cabrera Sánchez</u> NOMBRE Y FIRMA	TESTIGO REPRESENTANTE DE LA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS <u>FEELIX 16 NO 2 PUEBLO</u> NOMBRE Y FIRMA

[Signature]



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

RESUMEN FINANCIERO FINAL DE OBRA

DATOS GENERALES																	
CONTRATO: DOUM-R33-2019-AD-062		No. DE OBRA: SLG-092		IMPORTE DE OBRA CONTRATADA: \$ 1,342,365.25		NUMERO DE ESTIMACION: 1		ESTIMACION 2 FINIQUITO		No. DE HOJA							
NOMBRE DE LA OBRA: SLG-092 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION VARIAS CALLES, COL. AMPLIACION EJIDO LAZARO CARDENAS, DELEGACION DE SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B. C.		FECHA DE INICIO DEL PERIODO: 11 DE JULIO DE 2019		FECHA DE TERMINACION DE PERIODO: 20 DE AGOSTO DE 2019		FECHA DE ELABORACION DEL RESUMEN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2019		TOTAL DE HOJAS		2							
CONTRATISTA: C. PEDRO RIVERA GALEAS		FECHA DE INICIO: 12 DE JUNIO DEL 2019		FECHA DE TERMINACION: 20 DE AGOSTO DEL 2019		METAS EJECUTADAS											
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO:																	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	PERIODO DEL: 12/06/2019 AL: 10/07/2019			FECHA DE CONVENIO: 08/08/2019			PERIODO DEL: 11/07/2019 AL: 20/08/2019			PERIODO DEL: 12/06/2019 AL: 20/08/2019		
						ESTIMACION 1			CONVENIO MODIFICATORIO UNO			ESTIMACION 2 FINIQUITO			RESUMEN FINAL		
						CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
CONCEPTOS PRELIMINARES																	
1	2.- PAGO DE LA APROBACION,SUPERVICION Y MANO DE OBRA POR CONEXCION DEL PROYECTO, MEDIANTE OFICIO RESOLUTORIO DE COMUN ACUERDO DEL MONTO ESTIPULADO POR CFE., ENTREGAR LA DOCUMENTACION REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION DE CFE DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DEL INSTRUCTIVO POR TERCEROS CONSTRUCTORES DE INSTALACIONES DE RED SISTEMA AEREO PARA ENTREGA DE OBRAS PARA SU PROPIEDAD Y OPERACION DE LA MISMA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. REQUISITOS DE ENTREGA 1.- AVISO DE INICIO DE OBRA. 2.- CONVENIO DE OBRA 3.- SOLICITUD DE PLACAS PARA ENUMERAR POSTERIA. 4.- SOLICITUD DE NUMEROS ECONOMICOS DE BANCOS DE TRANSFORMACION. 5.- ACTA DE ENTREGA DE LAS INSTALACIONES A CFE. 6.- INVENTARIO FISICO VALORIZADO DE LA OBRA. 7.- ENTREGA DE FACTURAS DE LOS MATERIALES. 8.- LISTADO DE MATERIALES PROTOCOLIZADOS Y TRANSFERIDOS MEDIANTE CLAVE DE COMPRA A CFE EN (SIGLA 3). 9.- ENTREGA DE OFICIO DE PAGO DE SUTERM PARA AUTORIZACION DE CONEXION DE LA OBRA. 10.- ENTREGA CARTA RESPONSIVA O FIANZA DE GARANTIA POR UN AÑO A FAVOR DE CFE POR CUALQUIER DESPERFECTO QUE SE PUDIERA PRESENTA EN LA OBRA. 11.- ENTREGA DEL PROYECTO IMPRESO EN 90X60 DE OBRA TERMINADA GEORREFERENCIADO CON LA RED NACIONAL DE CFE. 12.- ENTREGA DE PROYECTO DIGITALIZADO GEORREFENCIADO EN 90X60 A CFE. 13.- SOLICITAR NUMERO DE MEMO CON FECHA DE CONEXION DE LA OBRA EN DPTO DE CONSTRUCCION. 14.- ENTREGA DE MATERIAL A CFE PARA LA CONEXION DE LA OBRA. 15.- LISTADO DE LOS USUARIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO ELECTRICO PARA SU CONTRATACION ANTE C.F.E.,-----	LOTE	1.00	\$ 37,540.48	\$ 37,540.48	0.00	\$ 37,540.48	\$ -	1.00	\$ 37,540.48	\$ 37,540.48	1.00	\$ 37,540.48	\$ 37,540.48	1.00	\$ 37,540.48	\$ 37,540.48
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS. 750 TIPO COSTA DONDE SE REQUIERA SE PODRA COLOCAR POSTE DE MADERA 40' Y/O 30' TRATADO CLASE 3 SEGÚN NORMA DE CFE, INCLUYE LEVANTAMIENTO Y TRAZO PARA SEMBRADO. NOTA: EL POSTE DE MADERA EN MENCION SE COLOCARA A MANIOBRA, ESTO POR TENER EL PUNTO DE COLOCACION DEL POSTE DE ACUERDO AL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA, EN TERRENO MUY ACCIDENTADO Y QUE NO SE PUEDA ACCIONAR EL EQUIPO DE GRUA PARA SU ANCLAMIENTO DEL POSTE DE CONCRETO.	PZA.	12.00	\$ 11,582.61	\$ 138,991.32	11.00	\$ 11,582.61	\$ 127,408.71	12.00	\$ 11,582.61	\$ 138,991.32	1.00	\$ 11,582.61	\$ 11,582.61	12.00	\$ 11,582.61	\$ 138,991.32
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 09 MTS. 400 TIPO COSTA DONDE SE REQUIERA SE PODRA COLOCAR POSTE DE MADERA 30' TRATADO CLASE 2 SEGÚN NORMA DE CFE, INCLUYE LEVANTAMIENTO Y TRAZO PARA SEMBRADO. NOTA: EL POSTE DE MADERA EN MENCION SE COLOCARA A MANIOBRA, ESTO POR TENER EL PUNTO DE COLOCACION DEL POSTE DE ACUERDO AL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA, EN TERRENO MUY ACCIDENTADO Y QUE NO SE PUEDA ACCIONAR EL EQUIPO DE GRUA PARA SU ANCLAMIENTO DEL POSTE DE CONCRETO.	PZA.	6.00	\$ 9,283.26	\$ 55,699.56	6.00	\$ 9,283.26	\$ 55,699.56	6.00	\$ 9,283.26	\$ 55,699.56	0.00	\$ 9,283.26	\$ -	6.00	\$ 9,283.26	\$ 55,699.56
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA AD20-2F CON CRUCETA DE MADERA CRESOTADA TIPO COSTA L8/200 -PARA CONCRETO	PZA.	1.00	\$ 6,873.66	\$ 6,873.66	1.00	\$ 6,873.66	\$ 6,873.66	1.00	\$ 6,873.66	\$ 6,873.66	0.00	\$ 6,873.66	\$ -	1.00	\$ 6,873.66	\$ 6,873.66
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA RD20-2F CON CRUCETA DE MADERA CRESOTADA TIPO COSTA L8/200 -PARA CONCRETO	PZA.	8.00	\$ 5,583.80	\$ 44,670.40	3.00	\$ 5,583.80	\$ 16,751.40	8.00	\$ 5,583.80	\$ 44,670.40	5.00	\$ 5,583.80	\$ 27,919.00	8.00	\$ 5,583.80	\$ 44,670.40
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA TS20. CON CRUCETA DE MADERA CRESOTADA TIPO COSTA L8/200 -PARA CONCRETO	PZA.	4.00	\$ 5,683.93	\$ 22,735.72	4.00	\$ 5,683.93	\$ 22,735.72	4.00	\$ 5,683.93	\$ 22,735.72	0.00	\$ 5,683.93	\$ -	4.00	\$ 5,683.93	\$ 22,735.72
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA 2T20-2F CON CRUCETA DE MADERA CRESOTADA TIPO COSTA L8/200 -PARA CONCRETO	PZA.	1.00	\$ 6,683.91	\$ 6,683.91	1.00	\$ 6,683.91	\$ 6,683.91	1.00	\$ 6,683.91	\$ 6,683.91	0.00	\$ 6,683.91	\$ -	1.00	\$ 6,683.91	\$ 6,683.91
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA 2V20-2F CON CRUCETA DE MADERA CRESOTADA TIPO COSTA L8/200 -PARA CONCRETO	PZA.	0.00	\$ 6,248.52	\$ -	0.00	\$ 6,248.52	\$ -	0.00	\$ 6,248.52	\$ -	0.00	\$ 6,248.52	\$ -	0.00	\$ 6,248.52	\$ -
9	SUMINISTRO Y COLOCACION 4BPR-(1/0-1/0-1/0) COBRE PARA PARA CONCRETO	PZA.	14.00	\$ 3,249.75	\$ 45,496.50	14.00	\$ 3,249.75	\$ 45,496.50	14.00	\$ 3,249.75	\$ 45,496.50	0.00	\$ 3,249.75	\$ -	14.00	\$ 3,249.75	\$ 45,496.50
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDAS RSA PARA CONCRETO	PZA.	8.00	\$ 3,848.95	\$ 30,791.60	8.00	\$ 3,848.95	\$ 30,791.60	8.00	\$ 3,848.95	\$ 30,791.60	0.00	\$ 3,848.95	\$ -	8.00	\$ 3,848.95	\$ 30,791.60
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDAS RSB PARA CONCRETO	PZA.	0.00	\$ 4,984.28	\$ -	0.00	\$ 4,984.28	\$ -	0.00	\$ 4,984.28	\$ -	0.00	\$ 4,984.28	\$ -	0.00	\$ 4,984.28	\$ -
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDAS RDA PARA CONCRETO	PZA.	1.00	\$ 4,788.72	\$ 4,788.72	1.00	\$ 4,788.72	\$ 4,788.72	1.00	\$ 4,788.72	\$ 4,788.72	0.00	\$ 4,788.72	\$ -	1.00	\$ 4,788.72	\$ 4,788.72
13	SUMINISTRO COLOCACION DE SISTEMAS DE TIERRA PARA APARTARRAYOS Y TRANSFORMADORES CON ALAMBRE DE Cu CAL 4 PARA CONCRETO	PZA.	7.00	\$ 3,983.98	\$ 27,887.86	7.00	\$ 3,983.98	\$ 27,887.86	7.00	\$ 3,983.98	\$ 27,887.86	0.00	\$ 3,983.98	\$ -	7.00	\$ 3,983.98	\$ 27,887.86
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE TRANSFORMACION DE 37.50KVA 13200/120/240 NORMA C.F.E. TIPO COSTA PARA CONCRETO INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION-CRUCETA-PT200,CUCHILLAS PORTA FUSIBLE, APARTARRAYOS, MENZULAS, CONECTORES LINEA VIVA, ALAMBRE DE COBRE DEL 4 PARA ATERRIZAR CARCASA Y APARTARRAYOS.	PZA.	1.00	\$ 68,756.10	\$ 68,756.10	1.00	\$ 68,756.10	\$ 68,756.10	1.00	\$ 68,756.10	\$ 68,756.10	0.00	\$ 68,756.10	\$ -	1.00	\$ 68,756.10	\$ 68,756.10
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR PRIMARIO CABLE DESNUDO ACSR AL AW 1/0 TIPO COSTA	ML	775.60	\$ 98.59	\$ 76,466.40	775.60	\$ 98.59	\$ 76,466.40	775.60	\$ 98.59	\$ 76,466.40	0.00	\$ 98.59	\$ -	775.60	\$ 98.59	\$ 76,466.40
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CONDUCTOR 2+1 3/0 AW TIPO NEUTRANEL PARA SECUNDARIO	ML	498.80	\$ 145.14	\$ 72,395.83	498.80	\$ 145.14	\$ 72,395.83	498.80	\$ 145.14	\$ 72,395.83	0.00	\$ 145.14	\$ -	498.80	\$ 145.14	\$ 72,395.83
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLEROS 120VOLTIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA LA CONEXIÓN DEL SERVICIO A BENEFICIADOS CON EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION.	PZA.	20.00	\$ 3,994.17	\$ 79,883.40	0.00	\$ 3,994.17	\$ -	20.00	\$ 3,994.17	\$ 79,883.40	20.00	\$ 3,994.17	\$ 79,883.40	20.00	\$ 3,994.17	\$ 79,883.40



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

RESUMEN FINANCIERO FINAL DE OBRA

DATOS GENERALES																			
CONTRATO: DOIUM-R33-2019-AD-062		No. DE OBRA: SLG-092		IMPORTE DE OBRA CONTRATADA: \$ 1,342,365.25		NUMERO DE ESTIMACION: 2		ESTIMACION 2 FINIQUITO		No. DE HOJA									
NOMBRE DE LA OBRA: SLG-092 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION VARIAS CALLES, COL. AMPLIACION EJIDO LAZARO CARDENAS, DELEGACION DE SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B. C.		FECHA DE TERMINACION: 20 DE AGOSTO DEL 2019		FECHA DE INICIO DEL PERIODO: 11 DE JULIO DE 2019		FECHA DE TERMINACION DE PERIODO: 20 DE AGOSTO DE 2019		FECHA DE ELEVACION DEL RESUMEN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2019		TOTAL DE HOJAS									
CONTRATISTA: C. PEDRO RIVERA GALEAS		FECHA DE INICIO: 12 DE JUNIO DEL 2019		METAS EJECUTADAS		PERIODO DEL: 12/08/2019 AL: 20/08/2019		PERIODO DEL: 11/07/2019 AL: 20/08/2019		PERIODO DEL: 12/08/2019 AL: 20/08/2019									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	PERIODO DEL: 12/08/2019 AL: 10/07/2019			FECHA DE CONVENIO: 08/08/2019 CONVENIO MODIFICATORIO UNO			PERIODO DEL: 11/07/2019 AL: 20/08/2019			PERIODO DEL: 12/08/2019 AL: 20/08/2019				
						ESTIMACION 1			CONVENIO MODIFICATORIO UNO			ESTIMACION 2 FINIQUITO			RESUMEN FINAL				
						CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE		
EXT	EXTRAORDINARIOS		1.00	\$ 5,480.00	\$ 5,480.00	0.00	\$ 5,480.00	\$ -	1.00	\$ 5,480.00	\$ 5,480.00	1.00	\$ 5,480.00	\$ 5,480.00	1.00	\$ 5,480.00	\$ 5,480.00		
EXT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDAS RDB PARA CONCRETO	PZA.																	
EXT-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE TRANSFORMACION DE 50KVA 13200/120/240 NORMA C.F.E. TIPO COSTA PARA CONCRETO INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION-CRUCETA-PT200,CUCHILLAS PORTA FUSIBLE, APARTARRAYOS, MENZULAS, CONECTORES LINEA VIVA, ALAMBRE DE COBRE CAL. 4 PARA ATERRIZAR CARCASA Y APARTARRAYOS	PZA.	2.00	\$ 73,121.04	\$ 146,242.08	0.00	\$ 73,121.04	\$ -	2.00	\$ 73,121.04	\$ 146,242.08	2.00	\$ 73,121.04	\$ 146,242.08	2.00	\$ 73,121.04	\$ 146,242.08		
EXT-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJAS SISTEMA ANTIFRAUDE TIPO PS.- RR.- TF.- SITRONIC NORMA CON ESPECIFICACION CFE	PZA.	13.00	\$ 13,955.08	\$ 181,416.04	0.00	\$ 13,955.08	\$ -	13.00	\$ 13,955.08	\$ 181,416.04	13.00	\$ 13,955.08	\$ 181,416.04	13.00	\$ 13,955.08	\$ 181,416.04		
EXT-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED TIPO AUTOBAHN ATBS-E-MVD2-120/277-377-240- INCLUYE FOTOCELDA P/ LUMINARIA LED CAT-DLL127ELECT.VOL. MARCA AEL/AMERICAN ELECTRIC LIGTING, CON TODO PARA SU FIJACION.	PZA.	6.00	\$ 14,890.52	\$ 89,343.12	0.00	\$ 14,890.52	\$ -	6.00	\$ 14,890.52	\$ 89,343.12	6.00	\$ 14,890.52	\$ 89,343.12	6.00	\$ 14,890.52	\$ 89,343.12		
EXT-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDAS RPP PARA CONCRETO	PZA.	1.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	0.00	\$ 3,200.00	\$ -	1.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	1.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	1.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00		
EXT-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO METALICO GALVANIZADO DE 2.40 MTS. DE LARGO POR 2" DE DIAMETRO CED-30, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA.	6.00	\$ 1,950.00	\$ 11,700.00	0.00	\$ 1,950.00	\$ -	6.00	\$ 1,950.00	\$ 11,700.00	6.00	\$ 1,950.00	\$ 11,700.00	6.00	\$ 1,950.00	\$ 11,700.00		
EXT-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DUPLEX UF 2X12, DE POSTE HASTA LA LAMPARA, INCLUYE: CONEXIONES Y PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	ML.	2.60	\$ 64.99	\$ 168.72	0.00	\$ 64.99	\$ -	2.5961	\$ 64.99	\$ 168.72	2.5961	\$ 64.99	\$ 168.72	2.5961	\$ 64.99	\$ 168.72		
					SUBTOTAL	\$ 1,157,211.43			SUBTOTAL	\$ 562,735.97			SUBTOTAL	\$ 594,475.45			SUBTOTAL	\$ 1,157,211.42	
					I.V.A.	\$ 185,153.83			I.V.A.	\$ 90,037.76			I.V.A.	\$ 185,153.83			I.V.A.	\$ 185,153.83	
					TOTAL	\$ 1,342,365.25			TOTAL	\$ 652,773.73			TOTAL	\$ 689,591.52			TOTAL	\$ 1,342,365.25	

EJERCIDO DEL CONTRATO (CON I.V.A.)	
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO	\$ 1,342,365.25
AMPLIACIONES AUTORIZADAS (CONVENIO MODIFICATORIO UNO)	\$ 553,379.82
REDUCCIONES AUTORIZADAS (CONVENIO MODIFICATORIO UNO)	\$ 553,379.82
IMPORTE FINAL DEL CONTRATO	\$ 1,342,365.25
ANTICIPO DE LA OBRA	\$ 402,709.58
SALDO SIN EJERCER	\$ -

EJERCIDO	\$652,773.73
EJERCIDO TOTAL	\$652,773.73
POR EJERCER	\$689,591.52
AMORTIZADO	\$195,832.12
TOTAL AMORTIZADO	\$ 195,832.12
POR AMORTIZAR	\$ 206,877.46
AVANCE	48.63%

EJERCIDO	\$689,591.52
EJERCIDO TOTAL	\$1,342,365.25
POR EJERCER	\$0.00
AMORTIZADO	\$206,877.46
TOTAL AMORTIZADO	\$402,709.58
POR AMORTIZAR	\$ -
AVANCE	100.00%

EJERCIDO	\$ 1,342,365.25
POR EJERCER	\$ -
AMORTIZADO	\$ 402,709.58
AVANCE FINAL	100.00%

POR LA CONTRATISTA

C. PEDRO RIVERA GALEAS
REPRESENTANTE LEGAL

VALIDO

ARQ. CARLOS HANS JURISTEBESPARZA
SUPERVISOR DE OBRA COMUNITARIA

Vo.Bo.



ARQ. HECTOR CORTES SERRANO
JEFE DEL DEPTO. OPERATIVO DE OBRA COMUNITARIA

Vo.Bo.

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON
SUBDIRECTOR DE OBRA COMUNITARIA

AUTORIZO



ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

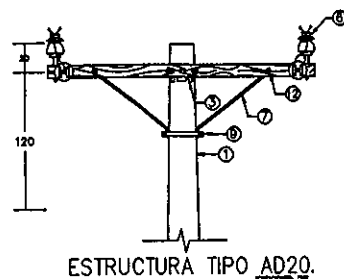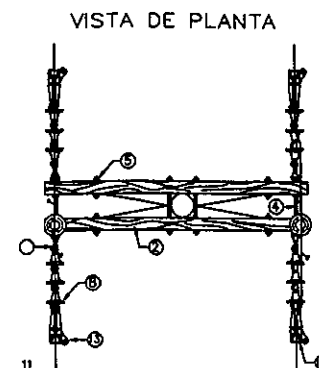

DESCRIPCION:


1. POSTE DE CONCRETO PC-12-750
2. CRUCETA DE MADERA CWP-P
3. DADO M
4. PERNO DOBLE ROSCA 18 x 457
5. TORNILLO DE MADERA 13 x 152
6. ASLADOR TIPO ALFILER 22 PC, 15 KV
7. TRINTE T2
8. ASLADOR DE SUSPENSION DE 4"
9. ABRACADORA 185
10. REMATE
11. DADO DE
12. PLACA IPC
13. GRAPA REMATE S/N

VISTA DE PLANTA


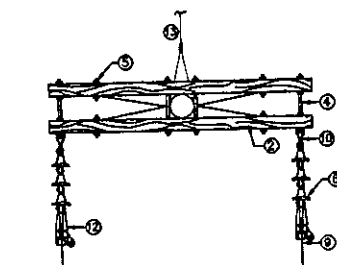


DESCRIPCION:

1. POSTE DE CONCRETO PC-12-750
2. CRUCETA DE MADERA CWP-P
3. DADO M
4. PERNO DOBLE ROSCA 18 x 457
5. TORNILLO DE MADERA 13 x 152
6. ASLADOR TIPO ALFILER 22 PC, 15 KV
7. TRINTE T2
8. ASLADOR DE SUSPENSION DE 4"
9. ABRACADORA 185
10. REMATE
11. DADO DE
12. PLACA IPC
13. GRAPA REMATE S/N
14. RETENIDA S/N

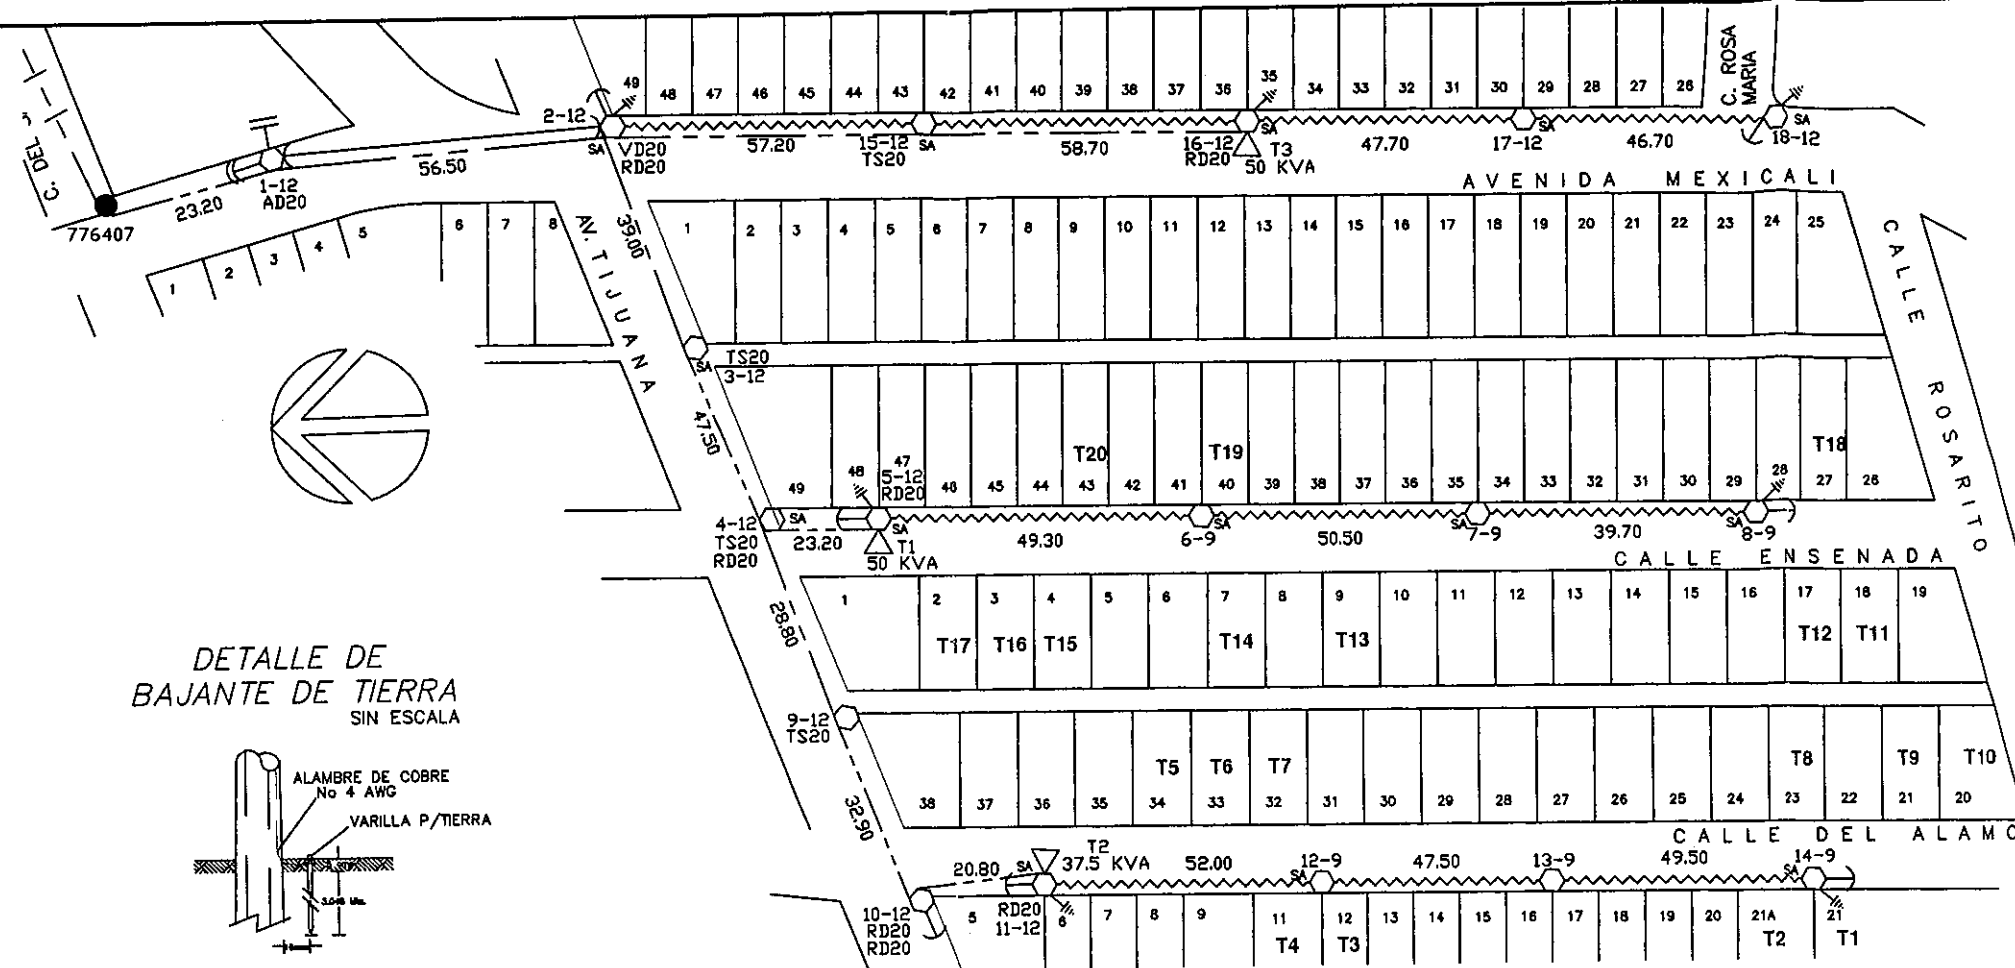

VISTA DE PLANTA

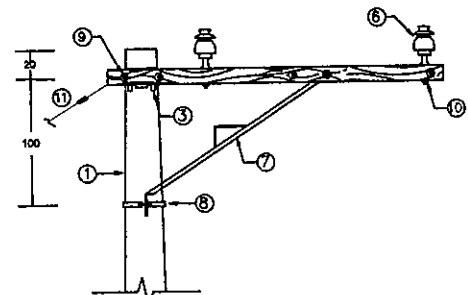


DESCRIPCION:


1. POSTE DE CONCRETO PC-12-750
2. CRUCETA DE MADERA CWP-P
3. DADO M
4. PERNO DOBLE ROSCA 18 x 457
5. TORNILLO DE MADERA 13 x 152
6. ASLADOR TIPO ALFILER 22 PC, 15 KV
7. TRINTE T1
8. ABRACADORA 185
9. PLACA IPC
10. REMATE DE PRESION DE 3/8" Y CONTRAFUERA
11. RETENIDA S/N

DETALLE DE ESTRUCTURAS SECUNDARIAS CON CAJA ANTIFRAUDE SIN ESCALA


ESTRUCTURA SECUNDARIA DE REMATE



ESTRUCTURA SECUNDARIA DE PASO CON TRANSFORMADOR





ESTRUCTURA SECUNDARIA DE PASO



ESTRUCTURA TIPO TS20.

DESCRIPCION:

1. POSTE DE CONCRETO PC-12-750
2. CRUCETA DE MADERA CWP-L
3. DADO M
4. ASLADOR TIPO ALFILER 22 PC, 15 KV
5. TUERCA Y ARANDELA DE PRESION
6. ABRACADORA 185

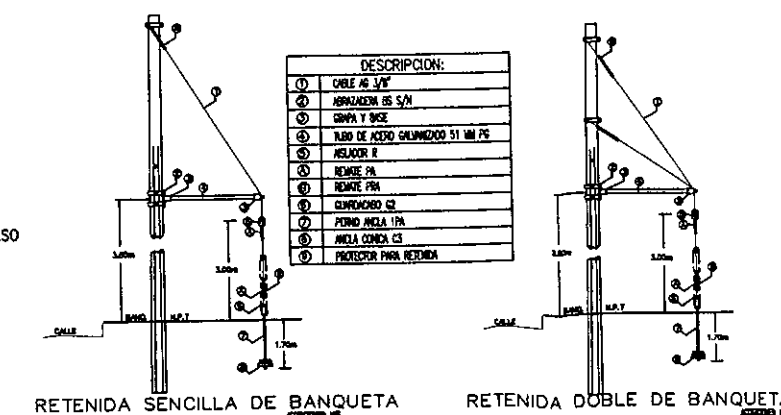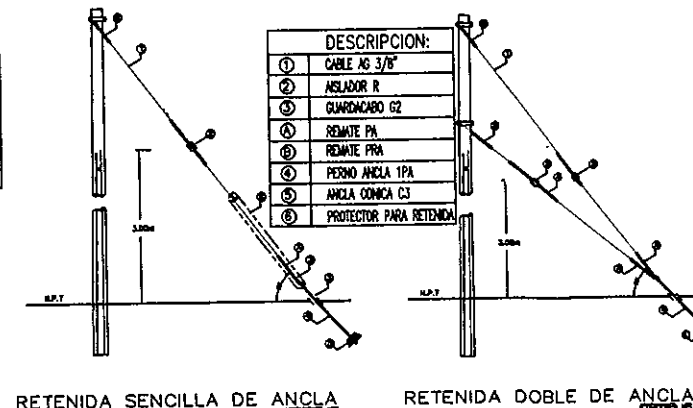

SIMBOLOGIA

1. LINEA PRIMARIA EXISTENTE DE 13.2 KV, 3F-3L, 1/0 AWG, FASES
2. LINEA PRIMARIA PROYECTADA DE 13.2 KV, 3F-3L, 1/0 AWG
3. LINEA AREA SECUNDARIA PROYECTADA PARA SISTEMA 240/120V, CON CABLE FIBRADO TIPO MULTITRANSE (2+1) CAL. 3/0 ACSE
4. TRANSFORMADOR TIPO POSTE 37.5KVA Y 50.00KVA 240/120 V, TIPO COSTA DOS BORNES CAPACIDAD REDUCIDA
5. RETENIDA SENCILLA DE BANQUETA (RBS)
6. RETENIDA DOBLE DE BANQUETA (RDB)
7. RETENIDA SENCILLA DE ANCLA (RSA)
8. RETENIDA DOBLE DE ANCLA (RDA)
9. RETENIDA DE POSTE A POSTE (RPP)
10. INDICA SISTEMA ANTIFRAUDE DE PASO
11. SISTEMA DE TIERRAS CAL. #4 CU

CEL-OTI

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TIJUANA

LEVANTO:

C. PEDRO RIVERA GALEAS

PERITO:

ING. ALMANZA BRACAMONESTES JOSÉ LUIS

No. FOLIO: 2277

OBRA: SLO-082 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION VARIAS CALLES, COL. AMPLIACION EJIDO LAZARO CARDENAS, DELEGACION DE SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B. C.

UBICACION:

COL. AMPLIACION EJIDO LAZARO CARDENAS, DELEGACION DE SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B. C.

No. CONTRATO: DOWM-R33-2019-AD-062

CONTENIDO: PLANO DE OBRA TERMINADO RED DE MEDIA Y BAJA TENSION

ESCALA: SIN ESCALA

FECHA: AGOSTO 2019

REVISO: PEDRO RIVERA GALEAS

PLANO: 1 DE 1

**SOFIMEX**

Bld. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500
www.sofimex.mx Autorizada por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para
otorgar seguros de caución y fianzas a título oneroso R.F.C. ASG- 950531-ID1

POLIZA DE FIANZA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN				FIANZA
TIJUANA BAJA CALIFORNIA, A 11 DE NOVIEMBRE DE 2019				2376387
MONTO DEL MOVIMIENTO				MOVIMIENTO
MONTO TOTAL DE LA FIANZA				EMISION
MONEDA				DOCUMENTO
OFICINA				2087084
PESOS				AGENTE
7				951
RAMO				
ADMINISTRATIVAS				
SUBRAMO				
OBRA				
SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A., Autorizada por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para otorgar seguros de caución y fianzas a título oneroso, se constituye fiadora hasta por la suma de:				
\$134,236.52 (**CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.**)				

ANTE: AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.

PARA GARANTIZAR POR: PEDRO RIVERA GALEAS CON R.F.C. RIGP-600425-8Z1 Y CON DOMICILIO EN CALLE ANTONIO NAVA NO. 10221, COL. MARIANO MATAMOROS, C.P. 22206, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, LOS VICIOS OCULTOS Y/O DEFECTOS DE CONSTRUCCION QUE RESULTAREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. DOJUM-R33-2019-AD-062 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2019, RELATIVO A: SLG-092 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES, COLONIA AMPLIACION EJIDO LAZARO CARDENAS, DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C., CON MONTO EJERCIDO DE \$ 1,342,365.25 M.N. (UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 25/100 MONEDA NACIONAL) INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE HASTA POR LA CANTIDAD DE \$ 134,236.52 M.N. (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 52/100 MONEDA NACIONAL) INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS: A) SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y DEMAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA. B) QUE LA FIANZA GARANTIZA LOS VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE CONSTRUCCION Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO EN LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS HAYAN SIDO SUBCONTRATADOS DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO. C) QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE HASTA POR 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS EN LA INTELIGENCIA QUE PARA SU CANCELACION SE REQUIERE LA AUTORIZACION EXPRESA DEL BENEFICIARIO. D) QUE EN EL CASO DE QUE SE PRESENTEN DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA HASTA QUE EL CONTRATISTA CORRIJA LOS DEFECTOS Y SATISFAGA LAS RESPONSABILIDADES, EN EL CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 282 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR Y AL REGLAMENTO DE DICHO NUMERAL, Y ESTA CONFORME EN QUE SE APLIQUE DICHO PROCEDIMIENTO. SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. SEÑALA COMO DOMICILIO EL UBICADO EN EDIFICIO COSMOPOLITAN BOULEVARD GENERAL SANCHEZ TABOADA NO. 9551-505, ZONA URBANA RIO TIJUANA, C.P. 22010, TIJUANA, B.C. DIRIGIDAS A SUS REPRESENTANTES.*** FIN DE TEXTO ***.

FIRMA

MERLIN GONZALEZ SAID
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

plae8B0UOWKc70xnpF2u2hzRWVSuz7iMeaWPYwNLu69VAniHHAkHxhXRU+59hmFTgINrSR8rIKCAIF6KxJdJpVz6FwzVBvEK8s6QW87NmgCwMRaSV34zmPKrkP8nukYhSggAAEVskaNSYXacGskfRnRQzUkU8PU8=
MERLIN GONZALEZ SAID

1

LINEA DE VALIDACIÓN 06023763878L+E16

1

Esta póliza se otorga en términos de las Normas Reguladoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en www.sofimex.mx
Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802508 o en www.amig.org.mx con la línea de validación: 06023763878L+E16

*En cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 209 y 210 de la LISP, la documentación contractual y la nota técnica, respectiva quedaron registradas ante la CNSF, a partir de los días 09, 10, 12, 15, 25 y 29 de julio de 2019 con los números: CNSF-S0805-0002-2019, CNSF-S0805-0003-2019, CNSF-S0805-0004-2019, CNSF-S0805-0005-2019, CNSF-S0805-0006-2019, CNSF-S0805-0007-2019, CNSF-S0805-0008-2019, CNSF-S0805-0010-2019, CNSF-S0805-0011-2019, CNSF-S0805-0012-2019, CNSF-S0805-0014-2019, CNSF-S0805-0015-2019, CNSF-S0805-0016-2019, CNSF-S0805-0017-2019, CNSF-S0805-0018-2019, CNSF-S0805-0019-2019, CNSF-S0805-0020-2019, CNSF-S0805-0021-2019, CNSF-S0805-0026-2019, CNSF-S0805-0029-2019, CNSF-S0805-0030-2019, CNSF-S0805-0031-2019, CNSF-S0805-0032-2019 y CGEN-S0805-0001-2019.



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

Dependencia: D.O.I.U.M.
Sección: Subdirección de obra comunitaria
Número de Oficio: SOC-XXIII-0375-2019
Expediente: N/A
Asunto: Invitación para acta de entrega-recepción.

Tijuana, Baja California a 22 de noviembre de 2019

C. PEDRO RIVERA GALEAS

C. ANTONIO NAVA No. 10221. COL. MARIANO MATAMOROS NORTE

TIJUANA, B.C.

P R E S E N T E

Por este medio reciba un cordial saludo, y al mismo tiempo me permito informarle que con fecha **Jueves 28 de Noviembre del 2019** en el horario que se indica, se llevará a cabo el Acto de Entrega-Recepción respecto de los trabajos denominados:

No. DE CONTRATO	DESCRIPCION DE OBRA	HORA
DOIUM-R33-2019-AD-062	"SLG-092 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES, COLONIA AMPLIACION EJIDO LAZARO CARDENAS, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C."	11:00 HRS

Lo anterior se hace de su conocimiento con el fin de que designe al personal a efecto de que haga acto de presencia al mismo en cumplimiento al artículo 69.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva prestar a la presente, me despido quedando en espera de su amable respuesta y a sus órdenes.

ATENTAMENTE
SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA

JOSE MANUEL QUINTANA ROLON

DESPACHADO

C.c.p. Mdu. Arq. Patricia Peterson Villalobos. - Secretaria De Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental del Ayuntamiento De Tijuana.
C.c.p. Arq. Javier Delgado Garibay. - Dirección de Obra e Infraestructura Urbana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana.
C.c.p.- Archivo Dirección

Expediente. JDG/JMQR/BSFR

*Recabi Original
22 Nov. 2019
Pedro Rivera Galeas*



☎ (664) 973-7000 🌐 tijuana.gob.mx

📍 Avenida Independencia 1350, Zona Urbana Río, C. P. 22010 Tijuana, Baja California, México
