

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
 SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 69 Y 70 DE LA "LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTO, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO:

DLP-035 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN C. CHAPALA, ENTRE RUTA MARIANO ABASOLO, COL. BLVR. BLAKE MORA, DELEGACION LA PRESA, TIJUANA B.C.

TIPO DE LICITACION:

LICITACION PUBLICA

NUMERO DE CONTRATO:

DOIUM-2019-R33-LP-003

FECHA DE INICIO Y TERMINACION SEGÚN CONTRATO:

25 DE JUNIO DE 2019 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FECHA DE INICIO Y TERMINACION SEGÚN CONVENIO ADICIONAL:

25 DE JUNIO DE 2019 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE LOS RECURSOS:

FONDO III RAMO 33

DOCUMENTO DE AUTORIZACION O APROBACION:

OFICIO DE APROBACIÓN No. IN-CAB/102/19 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2019

PROGRAMA:

FISMDF

EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA SIENDO LAS **17:00** HORAS DEL DÍA **26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, LOS RESPONSABLES DE LAS ENTIDADES O SUS REPRESENTANTES, ASÍ COMO EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL MENCIONADO CONTRATO O SU REPRESENTANTE DEBIDAMENTE ACREDITADO, LOS CUALES INTERVIENEN EN EL ACTO DE **ENTREGA-RECEPCIÓN** DE LOS TRABAJOS DESCRITOS

Alfredo Flores

Co

Concepcion Hdz. M

49

OK

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

EN EL CUADRO ANTERIOR, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE ESTA ACTA Y SUS ANTEFIRMAS EN CADA UNA DE LAS PAGINAS RESTANTES.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

DLP-035 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN C. CHAPALA, ENTRE RUTA MARIANO ABASOLO, COL. BLVR. BLAKE MORA, DELEGACION LA PRESA, TIJUANA B.C.

CONSISTENTE EN:

A PRELIMINARES

- 1 Trazo y nivelación del terreno en diferentes etapas del proceso de construcción; incluye: Equipo, Herramienta, Mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución
- 3 Suministro e instalación de caja plástica con tapa de concreto polimérico con mirilla de hierro dúctil HD. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, según especificaciones de cespt.
- 5 "Demolición de losa de pavimento y elementos de concreto existentes, incluye: perfilado con corte con disco de diamante, equipo y mano de obra."

B TERRACERIAS

- 6 Excavación de material tipo "B" hasta llegar a nivel de subrasante según planos; incluye: equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
- 9 Tratamiento de subrasante de 20.00 cms. de espesor, escarificado, homogenizado, incorporación de humedad, acamellonado, tendido y compactado al 95% proctor; incluye: equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
- 10 Construcción de base para recibir losa de concreto con material de banco (base hidráulica) capa de 20 cms de espesor, material petreo T.M.A. 1 1/2" compactada al 100% de su P.V.S.M., incluye: homogenizado, incorporación de humedad, acamellonado, tendido, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
- 11 "Construcción de aporche con material de banco (tucuruquay), compactado al 90% proctor de pvsm, incluye humedad, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución."
- 12 "Carga y acarreo de los materiales producto de los cortes a una distancia de 1.00 km; medido en sección incluye abundamiento, incluye: equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución."
- 13 "Acarreo de los materiales producto de los cortes a kms. subsiguientes; incluye: equipo, herramienta, mano de obra."

C ALBAÑILERIA

- 14 Construcción de guarnición tipo "L" de 130 lts/ml, incluye: cimbra, cimbrado, colado,

Alfredo F. C.

CONCEPCION H/T/E

L

4

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

curado, descimbrado, materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (No incluye suministro de concreto).

15 Colocación de concreto hidráulico premezclado MR-38 en losa de 15.00 cms de espesor t.m.a. 1 1/2", rev. 10 +/-2, colocación y tendido con regla vibratoria, pasa juntas en juntas de contracción @ 36.00 mts. y de construcción (junta fría) con barras lisas de 3/4" de diámetro y 60.00 cms. de longitud @ 60.00 cms. de separación (cold roll), corte con disco punta diamante a 1/3" del espesor de la losa de 1/8" de ancho y ensanchamiento de 1/4" para el sellado con backer rod de 1/4" y sellador sonomeric 1, realizando el corte al inicio del proceso del fraguado del concreto, vibrado, rayado grueso @ 1.20 m, curado con aspersores, y todo lo necesario para su correcta colocación, materiales, equipo, mano de obra necesaria, curado con curacreto base agua, (no incluye suministro de concreto).

16 Construcción de dentellón de 60 lts/ ml., incluye: cimbra, cimbrado, colocación, excavación, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (No incluye suministro de concreto)

17 Re nivelación de pozo de visita existente, incluye; demolición de protección de concreto, retiro y recuperación de contramarco con tapa de fo fo, descope, nivelación con ladrillo común, 7x18x28 cms. construcción de protección de concreto armado y colocación de contramarco con tapa de fo fo, aplanado interior con mortero cemento-arena proporción 1:4, todos los materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución; re nivelado hasta 50.00 cms. de alto (según especificaciones de cespt).

D LIMPIEZA

18 Limpieza general de obra, incluye: retiro de material escombros fuera de la obra al banco de tiro más cercano, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

E SUMINISTROS

19 Suministro y colocación de barras de amarre con varillas corrugadas de 1/2" de diámetro y 60.00 cms. de largo @ 60.00 cms., colocadas a mitad del espesor de la losa de concreto, incluye: materiales, habilitado, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

20 Suministro de fibra de polipropileno monofilamento en bolsa de 600.00 grs x cada m3 de concreto en losa.

21 Suministro de concreto hidráulico de MR-38, premezclado normal, tiro directo, agregado de 1/12"; incluye: suministro, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (para losa y dentellones)

22 Suministro de concreto hidráulico de resistencia $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, premezclado normal, tiro directo, agregado de 3/4"; incluye: suministro, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (para guarniciones)

EXT EXTRAORDINARIOS

EXT. 01 "Construcción de banquetas de 10 cm de espesor de concreto hidráulico $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ t.m.a. 3/4" normal, incluye suministro de concreto, preparación de la superficie, rellenos adicionales con material de banco, excavaciones y reforzada con malla electro soldada 6/6-10-10, materiales y mano de obra."

EXT. 02 Renivelación de registro de banqueta de toma domiciliaria, incluye: Retiro de caja negra, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta renivelación.

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

No incluye suministro de Caja Negra.

EXT. 03 Renivelación de registro sanitario. incluye: contramarco de solera de acero de 2 5/8"x1/8". tapa de concreto reforzado con alambón 1/4" a cada 20 cms en ambos sentidos, concreto f'c=200kg/cm2 con un espesor de 10 cms, cimbrado, dos agarraderas a base de alambón, materiales, equipo, herramientas y mano de obra. hasta una altura de 15 cms promedio y medida por tapa de 70X100cm.

EXT. 04 Suministro y colocación de señalamiento restrictivo SR-6 "ALTO" de lámina galvanizada cal. 16 de 0.61x0.61 m. (24"x24") de lado, con fondo de vinil reflejante grado ingeniería color rojo y letras en color blanco, en poste de PTR galvanizado y perforado de 2"x2" cal. 14. Incluye: tornillería para su fijación, material, equipo, herramienta y mano de obra.

FIANZA DE ANTICIPO:

FIANZA POR CUMPLIMIENTO:

"BERKLEY INTERNACIONAL FIANZAS MEXICO,
S.A. DE C.V. "
No. BKY-0001-0023848

"BERKLEY INTERNACIONAL FIANZAS MEXICO,
S.A. DE C.V. "
No. BKY-0001-0023849

MONTO TOTAL EJERCIDO C/IVA:

FECHA DE TERMINACION REAL:

\$ 1,600,000.00 M.N.

22 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PAGOS EN ESTIMACIONES:

IMPORTE

ESTIMACION 1
ESTIMACION 2
ESTIMACION 3
ESTIMACION 4 FINIQUITO

\$	1,002,498.95	✓
\$	106,834.88	✓
\$	479,240.16	✓
\$	11,426.01	✓
<hr/>		
\$	1,600,000.00 M.N.	✓

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGÚN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, A FIN DE SER RECIBIDOS POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Alfreda F. C.

Concepcion HDEs

L

9/9

CONTRATO: **DOIUM-2019-R33-LP-003**


**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA


LA PRESENTE ACTA **NO EXIME** AL CONTRATISTA SOBRE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR EN LOS TRABAJOS REALIZADOS OBJETO DE LA PRESENTE ACTA, PARA LO CUAL, DE SER NECESARIO, SE RESPONDERA A SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES MEDIANTE LA UTILIZACION DE LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS CON No. BKY-0001-0029713 DE BERKLEY INTERNACIONAL FIANZAS MEXICO, S.A DE C.V. DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019, POR UN MONTO DE \$ 160,000.00 M.N (CIENTO SESENTA MIL PESOS CON 00/100 M.N).

ASISTENTES AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION Y FIRMAS:

ENTREGA
"LA CONTRATISTA"



LIC. NORA MEZA OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL




CONTRATO: DOIUM-2019-R33-LP-003

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

**RECIBE
"LA CONTRATANTE"**

DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA
URBANA MUNICIPAL DEL H. XXII
AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.



ARQ. VICTOR MANUEL VALENZUELA OLIVAS

TESTIGO
REPRESENTANTE DEL SINDICO PROCURADOR
DE H. XXII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C

NOMBRE Y FIRMA


TESTIGO
COMITÉ DE OBRA

Alfredo Flores Callejas
NOMBRE Y FIRMA

CONCEPCION HDEI

RECIBE

SUB-DIRECCION DE OBRA COMUNITARIA
(RAMO 33).



ARQ. ENRIQUE ALEJANDRO GUEVARA ROSAS

TESTIGO
SUPERVISOR TECNICO OBRA COMUNITARIA

hACE

ING. LUIS ALFONSO CISNEROS FLORES

TESTIGO
REPRESENTANTE DE LA DELEGACION LA
PRESA A.L.R.

Manuel A. Garcia Aulo
NOMBRE Y FIRMA



RESUMEN FINANCIERO FINAL DE OBRA

XXII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA		DATOS GENERALES		IMPORTE DE OBRA CONTRATADA: \$ 1,600,000.00		NUMERO DE ESTIMACION: 4 (CUATRO) FINIQUITO	
CONTRATO:	DOIUM-2019-R33-LP-003	No. DE OBRA:	DLP-035			FECHA DE INICIO DE PERIODO: 15 DE AGOSTO DE 2019	
NOMBRE DE LA OBRA:	DLP-035 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. CHAPALA, ENTRE RUTA MARIANO ABASOLO, COL. BLVR. BLAKE MORA, DELEGACIÓN LA PRESA, TIJUANA, B.C.			LUGAR: COL. EL PIPILA, TIJUANA, B.C.		FECHA DE TERMINACION DE PERIODO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
CONTRATISTA:	LIC. NORA MEZA OROZCO			PROGRAMA: RAMO XXXIII		FECHA DE ELABORACION DE EST. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
FECHA INICIO:	25 DE JUNIO DE 2019	FECHA DE TERMINACION:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2019				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	METAS EJECUTADAS																			
						PERIODO DEL 25 DE JUN. AL 11 DE JUL. 2019			FECHA DE ELABORACION: 07 DE AGOSTO DE 2019			PERIODO DEL 12 DE JUL. AL 08 DE AGO. 2019			PERIODO DEL 09 DE AGO. AL 14 DE AGO. 2019			PERIODO DEL 15 DE AGO. AL 22 DE SEPT. 2019							
						CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE					
17	Re nivelación de pozo de visita existente, incluye: demolición de protección de concreto, retiro y recuperación de contramarco con tapa de fo fo, descope, nivelación con ladrillo común, 7x18x28 cms. construcción de protección de concreto armado y colocación de contramarco con tapa de fo fo, aplanado interior con mortero cemento-arena proporción 1:4, todos los materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución; re nivelado hasta 50.00 cms. de alto (según especificaciones de cespt).	PZA	2.00	\$ 4,299.93	\$ 8,599.86	2.00	\$ 4,299.93	\$ 8,599.86	2.00	\$ 4,299.93	\$ 8,599.86	0.00	\$ 4,299.93	\$ -	0.00	\$ 4,299.93	\$ -	0.00	\$ 4,299.93	\$ -	2.00	\$ 4,299.93	\$ 8,599.86		
D	LIMPIEZA																								
18	Limpieza general de obra, incluye: retiro de material escombros fuera de la obra al banco de tiro mas cercano, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,780.50	\$ 6.51	\$ 11,591.06	0.00	\$ 6.51	\$ -	1781.109	\$ 6.51	\$ 11,595.02	0.000	\$ 6.51	\$ -	1781.109	\$ 6.51	\$ 11,595.02	0.00	\$ 6.51	\$ -	1781.11	\$ 6.51	\$ 11,595.02		
E	SUMINISTROS			24.18																					
19	Suministro y colocación de barras de amarre con varillas corrugadas de 1/2" de diámetro y 60.00 cms. de largo @ 60.00 cms., colocadas a mitad del espesor de la losa de concreto, incluye: materiales, habilitado, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1,075.00	\$ 18.50	\$ 19,887.50	1022.69	\$ 18.50	\$ 18,919.77	1022.74	\$ 18.50	\$ 18,920.89	0.00	\$ 18.50	\$ -	0.05	\$ 18.50	\$ 0.92	0.00	\$ 18.50	\$ -	1022.74	\$ 18.50	\$ 18,920.69		
20	Suministro de fibra de polipropileno monofilamento en bolsa de 600.00 grs x cada m3 de concreto en losa.	BOLSA	215.00	\$ 90.01	\$ 19,352.15	215.00	\$ 90.01	\$ 19,352.15	215.00	\$ 90.01	\$ 19,352.15	0.00	\$ 90.01	\$ -	0.00	\$ 90.01	\$ -	0.00	\$ 90.01	\$ -	215.00	\$ 90.01	\$ 19,352.15		
21	Suministro de concreto hidráulico de MR-38, premezclado normal, tiro directo, agregado de 1/12"; incluye: suministro, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (para losa y dentellones)	M3	214.11	\$ 1,900.00	\$ 406,809.00	214.11	\$ 1,900.00	\$ 406,809.00	211.47	\$ 1,900.00	\$ 401,793.00	0.00	\$ 1,900.00	\$ -	-2.64	\$ 1,900.00	\$ 5,016.00	0.00	\$ 1,900.00	\$ -	211.47	\$ 1,900.00	\$ 401,793.00		
22	Suministro de concreto hidráulico de resistencia f'c= 200 kg/cm2, premezclado normal, tiro directo, agregado de 3/4"; incluye: suministro, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (para guarniciones)	M3	56.00	\$ 1,750.00	\$ 98,000.00	55.82	\$ 1,750.00	\$ 97,685.00	55.82	\$ 1,750.00	\$ 97,685.00	0.00	\$ 1,750.00	\$ -	0.00	\$ 1,750.00	\$ -	0.00	\$ 1,750.00	\$ -	55.82	\$ 1,750.00	\$ 97,685.00		
EXT	EXTRAORDINARIOS																								
EXT. 01	Construcción de banqueteta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico f'c= 200 kg/cm2 l.m.a 3/4" normal, incluye suministro de concreto, preparación de la superficie, rellenos adicionales con material de banco, excavaciones y reforzada con malla electro soldada 6/6-10-10, materiales y mano de obra.	M2	-	\$ 430.00	\$ -	0.00	\$ 430.00	\$ -	808.00	\$ 430.00	\$ 347,440.00	0.00	\$ 430.00	\$ -	808.00	\$ 430.00	\$ 347,440.00	0.00	\$ 430.00	\$ -	808.00	\$ 430.00	\$ 347,440.00		
EXT. 02	Renivelación de registro de banqueteta de toma domiciliar, incluye: Retiro de caja negra, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta nivelación. No incluye suministro de Caja Negra.	PZA	-	\$ 850.00	\$ -	0.00	\$ 850.00	\$ -	18.00	\$ 850.00	\$ 15,300.00	0.00	\$ 850.00	\$ -	18.00	\$ 850.00	\$ 15,300.00	0.00	\$ 850.00	\$ -	18.00	\$ 850.00	\$ 15,300.00		
EXT. 03	Renivelación de registro sanitario, incluye: contramarco de solera de acero de 2 5/8"x1/8", tapa de concreto reforzado con alambón 1/4" a cada 20 cms en ambos sentidos, concreto f'c=200kg/cm2 con un espesor de 10 cms, cimbrado dos acarraderas a base de alambón, materiales, equipo, herramientas y mano de obra hasta una altura de 15 cms promedio y medida por tapa de 70X100cm.	PZA	-	\$ 1,350.00	\$ -	0.00	\$ 1,350.00	\$ -	19.00	\$ 1,350.00	\$ 25,650.00	0.00	\$ 1,350.00	\$ -	16.00	\$ 1,350.00	\$ 21,600.00	3.00	\$ 1,350.00	\$ 4,050.00	19.00	\$ 1,350.00	\$ 25,650.00		
EXT. 04	Suministro y colocación de señalamiento restrictivo SR-6 "ALTO" de lámina galvanizada cal. 16 de 0.61x0.61 m. (24"x24") de lado, con fondo de vinil reflejante grado ingeniería color rojo y letras en color blanco, en poste de PTR galvanizado y perforado de 2"x2" cal. 14. Incluye: tornillería para su fijación, material, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	-	\$ 2,900.00	\$ -	0.00	\$ 2,900.00	\$ -	2.00	\$ 2,900.00	\$ 5,800.00	0.00	\$ 2,900.00	\$ -	0.00	\$ 2,900.00	\$ -	2.00	\$ 2,900.00	\$ 5,800.00	2.00	\$ 2,900.00	\$ 5,800.00		
					SUBTOTAL	\$ 956,322.27						SUBTOTAL	\$ 864,223.23						SUBTOTAL	\$ 1,379,310.35					
					IVA	\$ 153,011.56						IVA	\$ 138,275.72						IVA	\$ 220,689.65					
					TOTAL	\$ 1,109,333.83						TOTAL	\$ 1,002,498.95						TOTAL	\$ 1,600,000.00					

EJERCIDO DEL CONTRATO CON IVA	\$ 1,109,333.83
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO	\$ 523,133.42
AMPLIACIONES AUTORIZADAS CONVENIO ADICIONAL	\$ 32,467.25
REDUCCIONES AUTORIZADAS CONVENIO ADICIONAL	\$ 1,600,000.00
IMPORTE FINAL DE OBRA:	\$ 332,800.15
ANTICIPO DE OBRA	\$ -
SALDO SIN EJERCER	\$ -

EJERCIDO	\$ 1,002,498.95
TOTAL EJERCIDO	\$ 1,002,498.95
POR EJERCER	\$ 106,834.88
AMORTIZADO	\$ 300,749.69
TOTAL AMORTIZADO	\$ 32,050.46
POR AMORTIZAR	\$ 90.37%

EJERCIDO	\$ 106,834.88	EJERCIDO	\$ 479,240.16	EJERCIDO	\$ 11,426.01	EJERCIDO	\$ 1,600,000.00
TOTAL EJERCIDO	\$ 1,109,333.83	TOTAL EJERCIDO	\$ 1,588,573.99	TOTAL EJERCIDO	\$ 1,600,000.00	TOTAL EJERCIDO	\$ 1,600,000.00
POR EJERCER	\$ 490,666.17	POR EJERCER	\$ 11,426.01	POR EJERCER	\$ -	POR EJERCER	\$ -
AMORTIZADO	\$ 32,050.46	AMORTIZADO	\$ -	AMORTIZADO	\$ -	AMORTIZADO	\$ 332,800.15
TOTAL AMORTIZADO	\$ 332,800.15						
POR AMORTIZAR	\$ -						
AVACE	69.33%	AVACE	99.29%	AVACE	100.00%	AVACE	99.29%

EL CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL
[Firma]
LIC. NORA MEZA OROZCO

REVISOR SUPERVISOR D.O.I.U.M.
[Firma]
ING. LUIS ALFONSO CISNEROS FLORES


VALIDO JEFE DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA
[Firma]
ING. HECTOR CORTES SERRANO

Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE OBRA COMUNITARIA-DOIUM
[Firma]
ABD. ENRIQUE ALEJANDRO GUEVARA ROSAS


AUTORIZO DIRECTOR DE DOIUM
[Firma]
ABD. VICTOR MANUEL VALENZUELA OLIVAS

Alfreda F.C.

Concepcion Alca
[Firma]

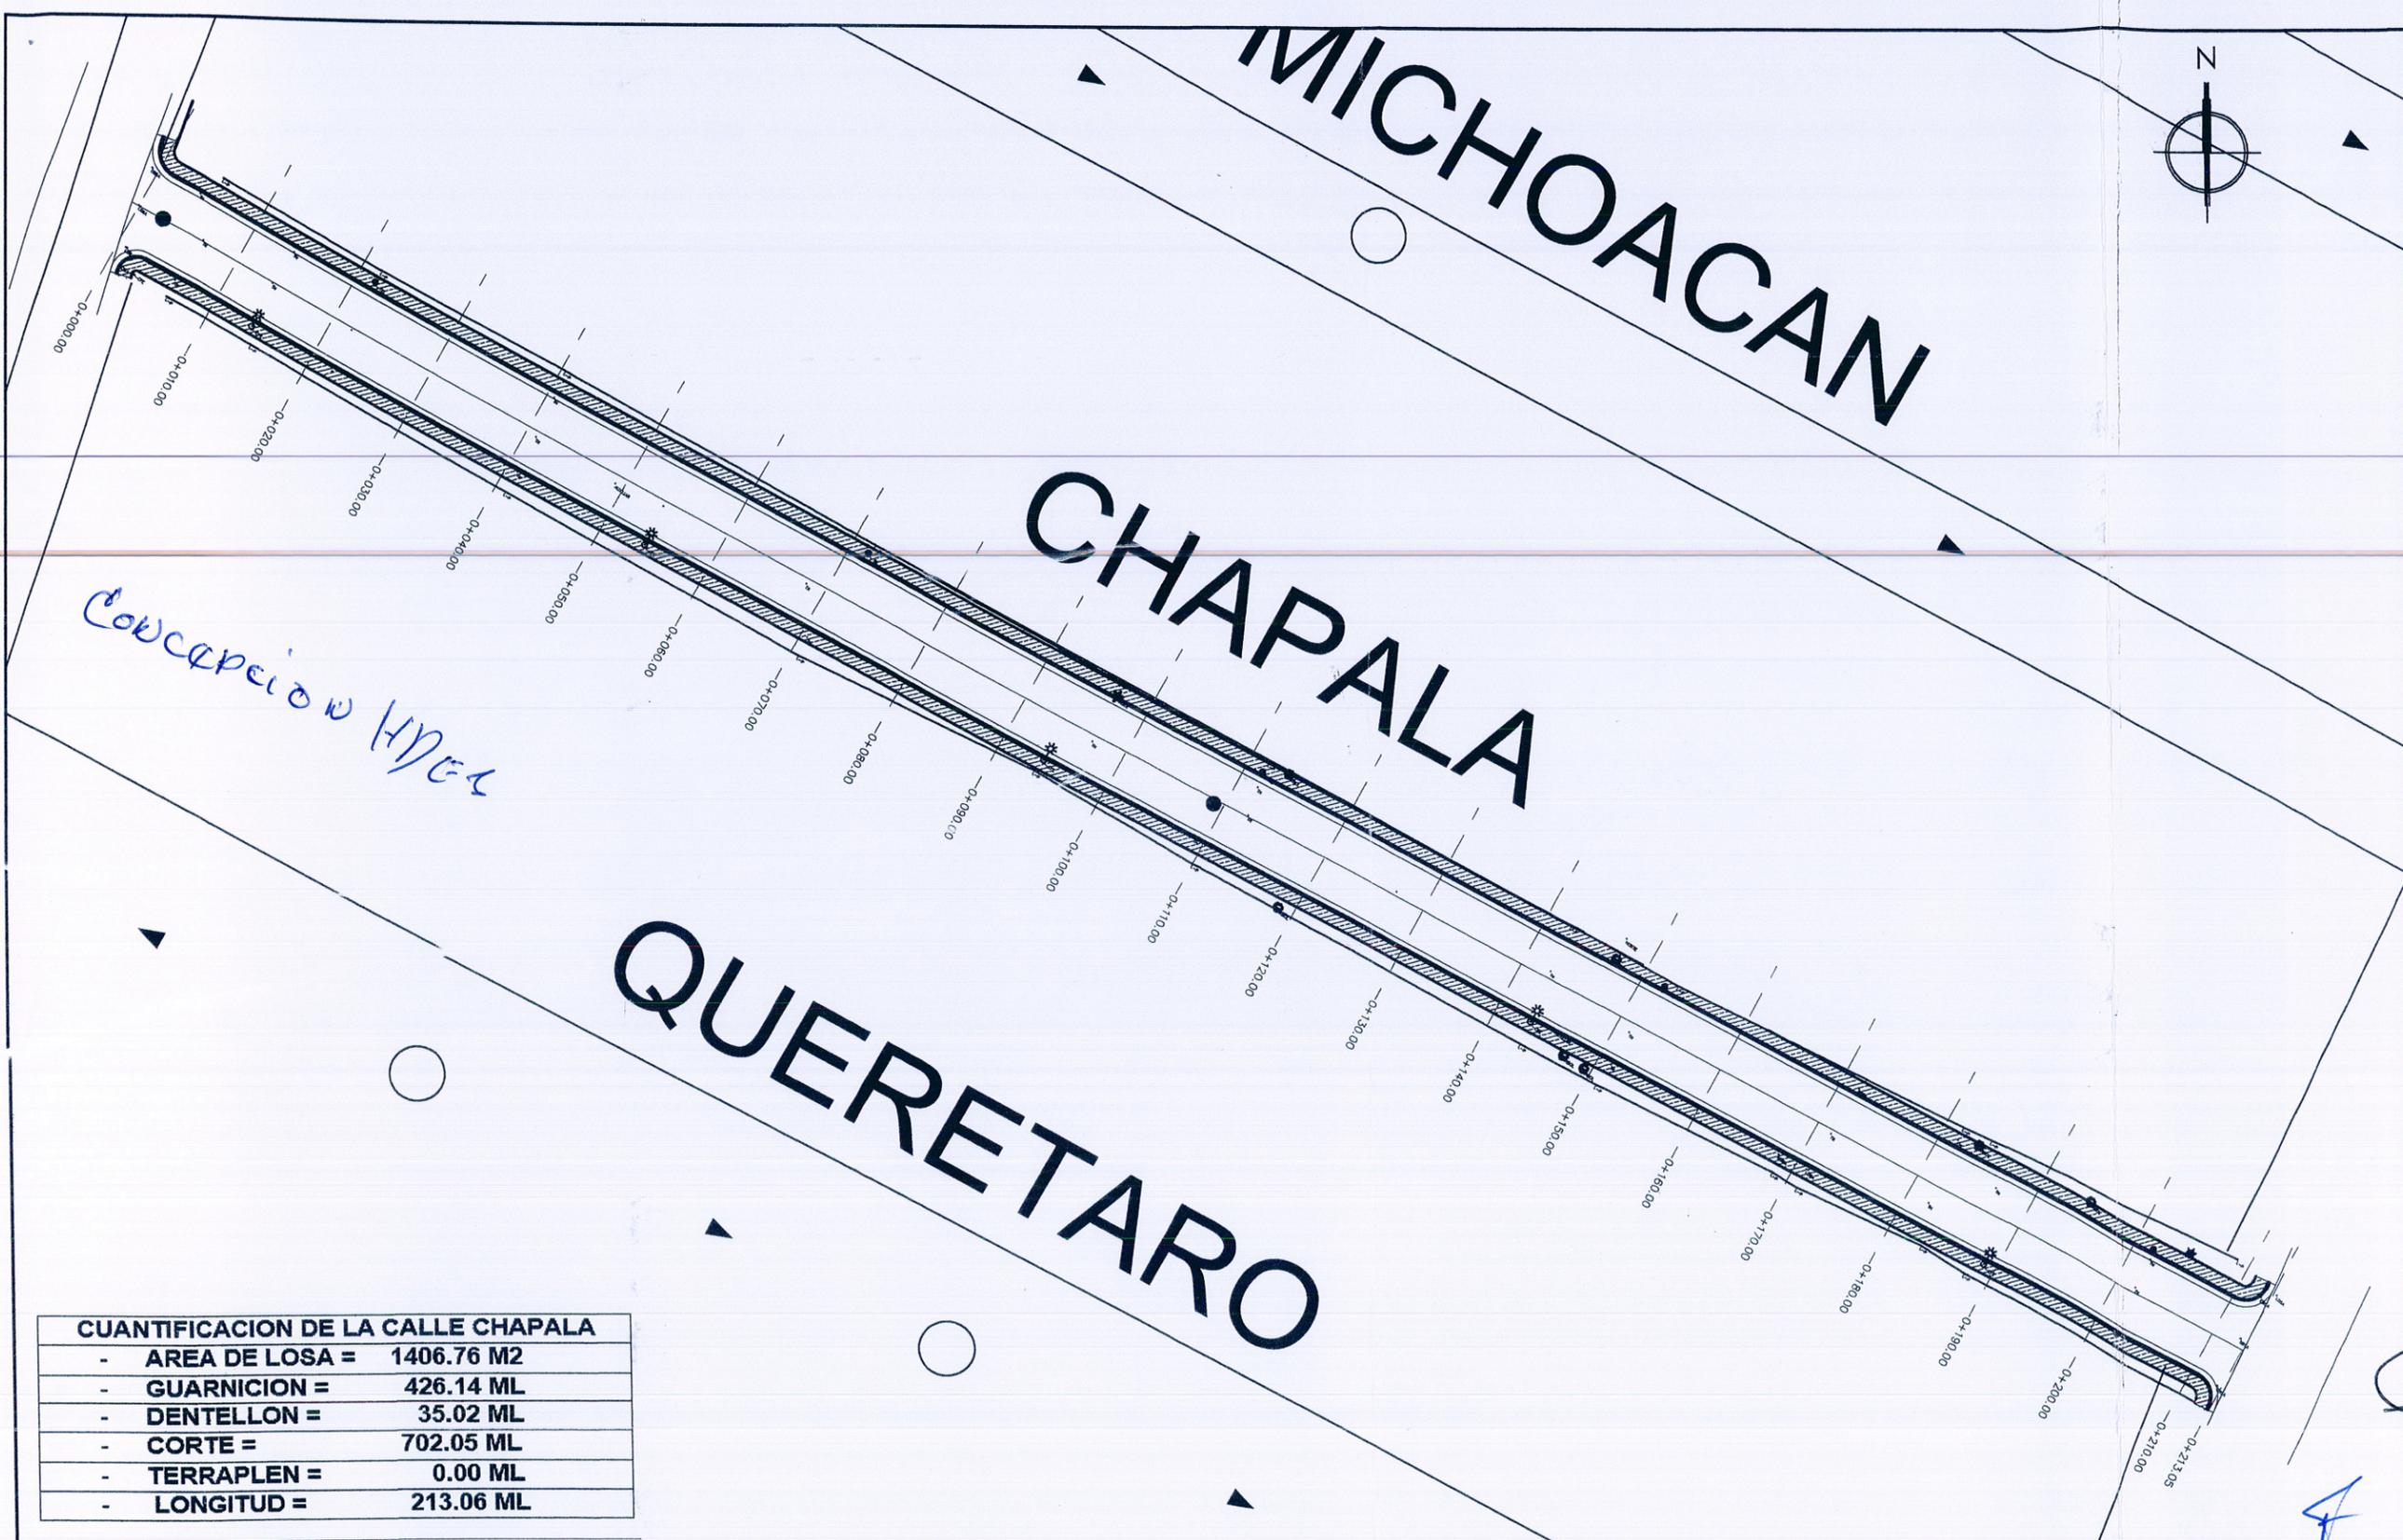

CUANTIFICACION DE LA CALLE CHAPALA	
- AREA DE LOSA =	1406.76 M2
- GUARNICION =	426.14 ML
- DENTELLON =	35.02 ML
- CORTE =	702.05 ML
- TERRAPLEN =	0.00 ML
- LONGITUD =	213.06 ML

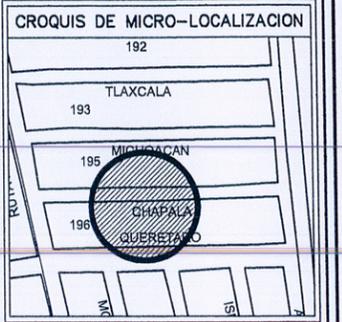

SIMBOLOGIA

NO. DE OBRA

DLP-035

CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES
NORA MEZA

Nora Meza
 LIC. NORA MEZA OROZCO
 REPRESENTANTE LEGAL

Ernesto Segura Aguirre
 ARQ. ERNESTO SEGURA AGUIRRE
 PERITO RESPONSABLE No. 2527

DATOS DE PROYECTO

PROYECTO:
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN C. CHAPALA, ENTRE RUTA MARIANO ABASOLO, COL. BLVR. BLAKE MORA, TIJUANA, B.C.

DELEGACION: LA PRESA

CONTENIDO: PLANTA DE CONJUNTO

PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA

ESCALA: N/A ACOTACIONES: METROS

FECHA: MARZO 2019 Plano: 1 De: 3

01
 AQ-01


PLANTA DE CONJUNTO EN C. CHAPALA

PLANO DE OBRA TERMINADA - CONJUNTO



Alfredo F.C.

M

L

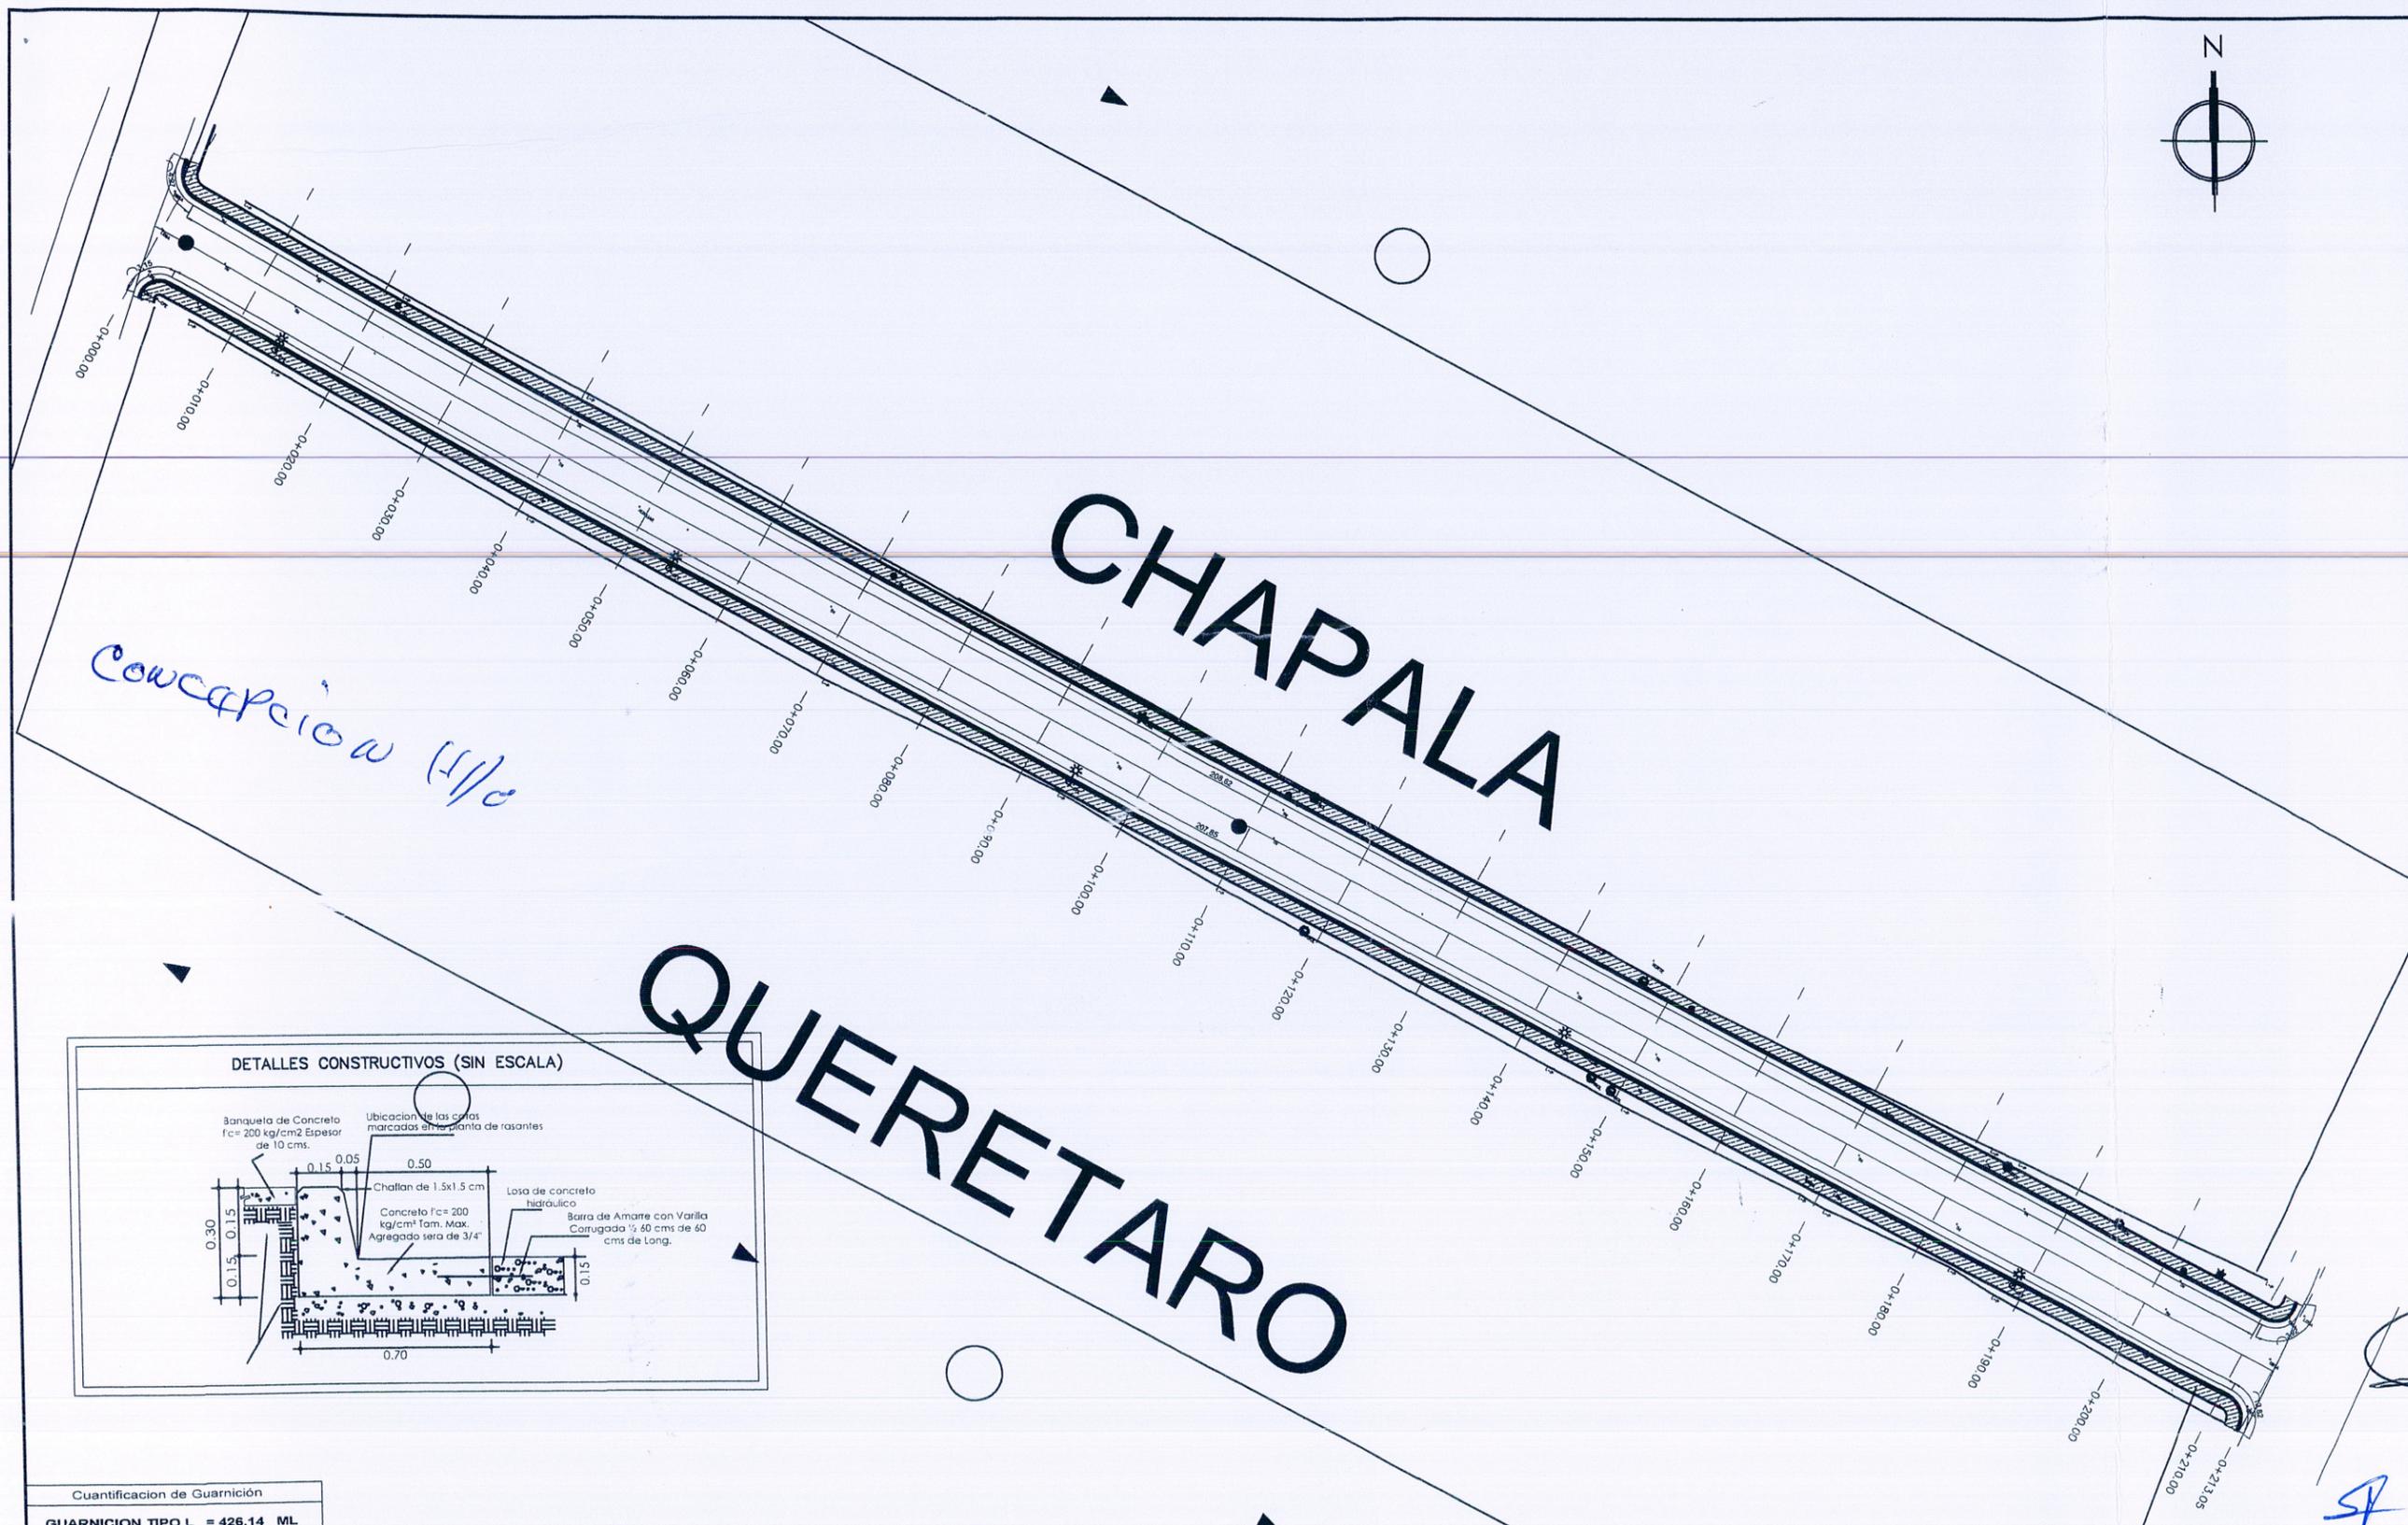

concreción 1/10

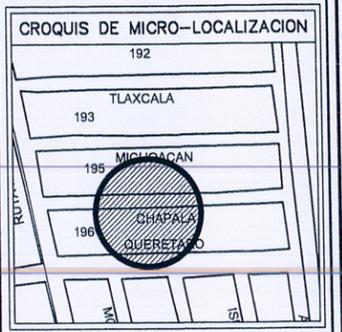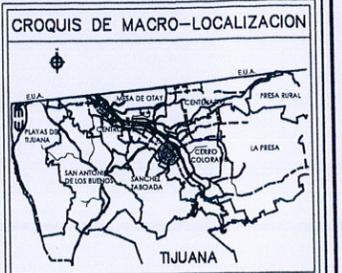


SIMBOLOGIA

--

NO. DE OBRA

DLP-035

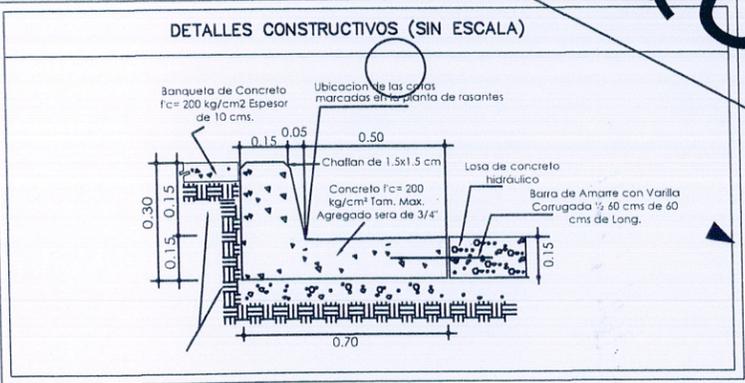

Cuantificación de Guarnición

GUARNICION TIPO L = 426.14 ML

01
AQ-01

PLANTA DE GUARNICION EN C. CHAPALA

PLANO DE OBRA TERMINADA - GUARNICION

Alfredo F.C.

CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES

NORA MEZA

Nora Meza

LIC. NORA MEZA ORÓZCO
REPRESENTANTE LEGAL

Ernesto Segura Aguilar

ARG. ERNESTO SEGURA AGUILAR
PERITO RESPONSABLE No. 2527

DATOS DE PROYECTO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN C. CHAPALA, ENTRE RUTA MARIANO ABASOLO, COL. BLVR. BLAKE MORA, TIJUANA, B.C.

DELEGACION: LA PRESA

CONTENIDO: GUARNICION


PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA

ESCALA: N/A ACOTACIONES: METROS

FECHA: MARZO 2019

Plano: 2 De: 3

Handwritten signature and initials

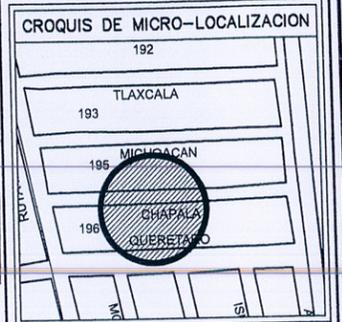

SIMBOLOGIA

--	--

NO. DE OBRA

DLP-035

CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES
NORA MEZA
[Signature]
LIC. NORA MEZA OROZGO
REPRESENTANTE-LEGAL

ARQ. ERNESTO SEGURA AGUILAR
PERITO RESPONSABLE No. 2527

DATOS DE PROYECTO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN C. CHAPALA, ENTRE RUTA MARIANO ABASOLO, COL. BLVR. BLAKE MORA, TIJUANA, B.C.


DELEGACION: LA PRESA

CONTENIDO: LOSA


PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA

ESCALA: N/A ACOTACIONES: METROS

FECHA: MARZO 2019 Plano: 3 De: 3

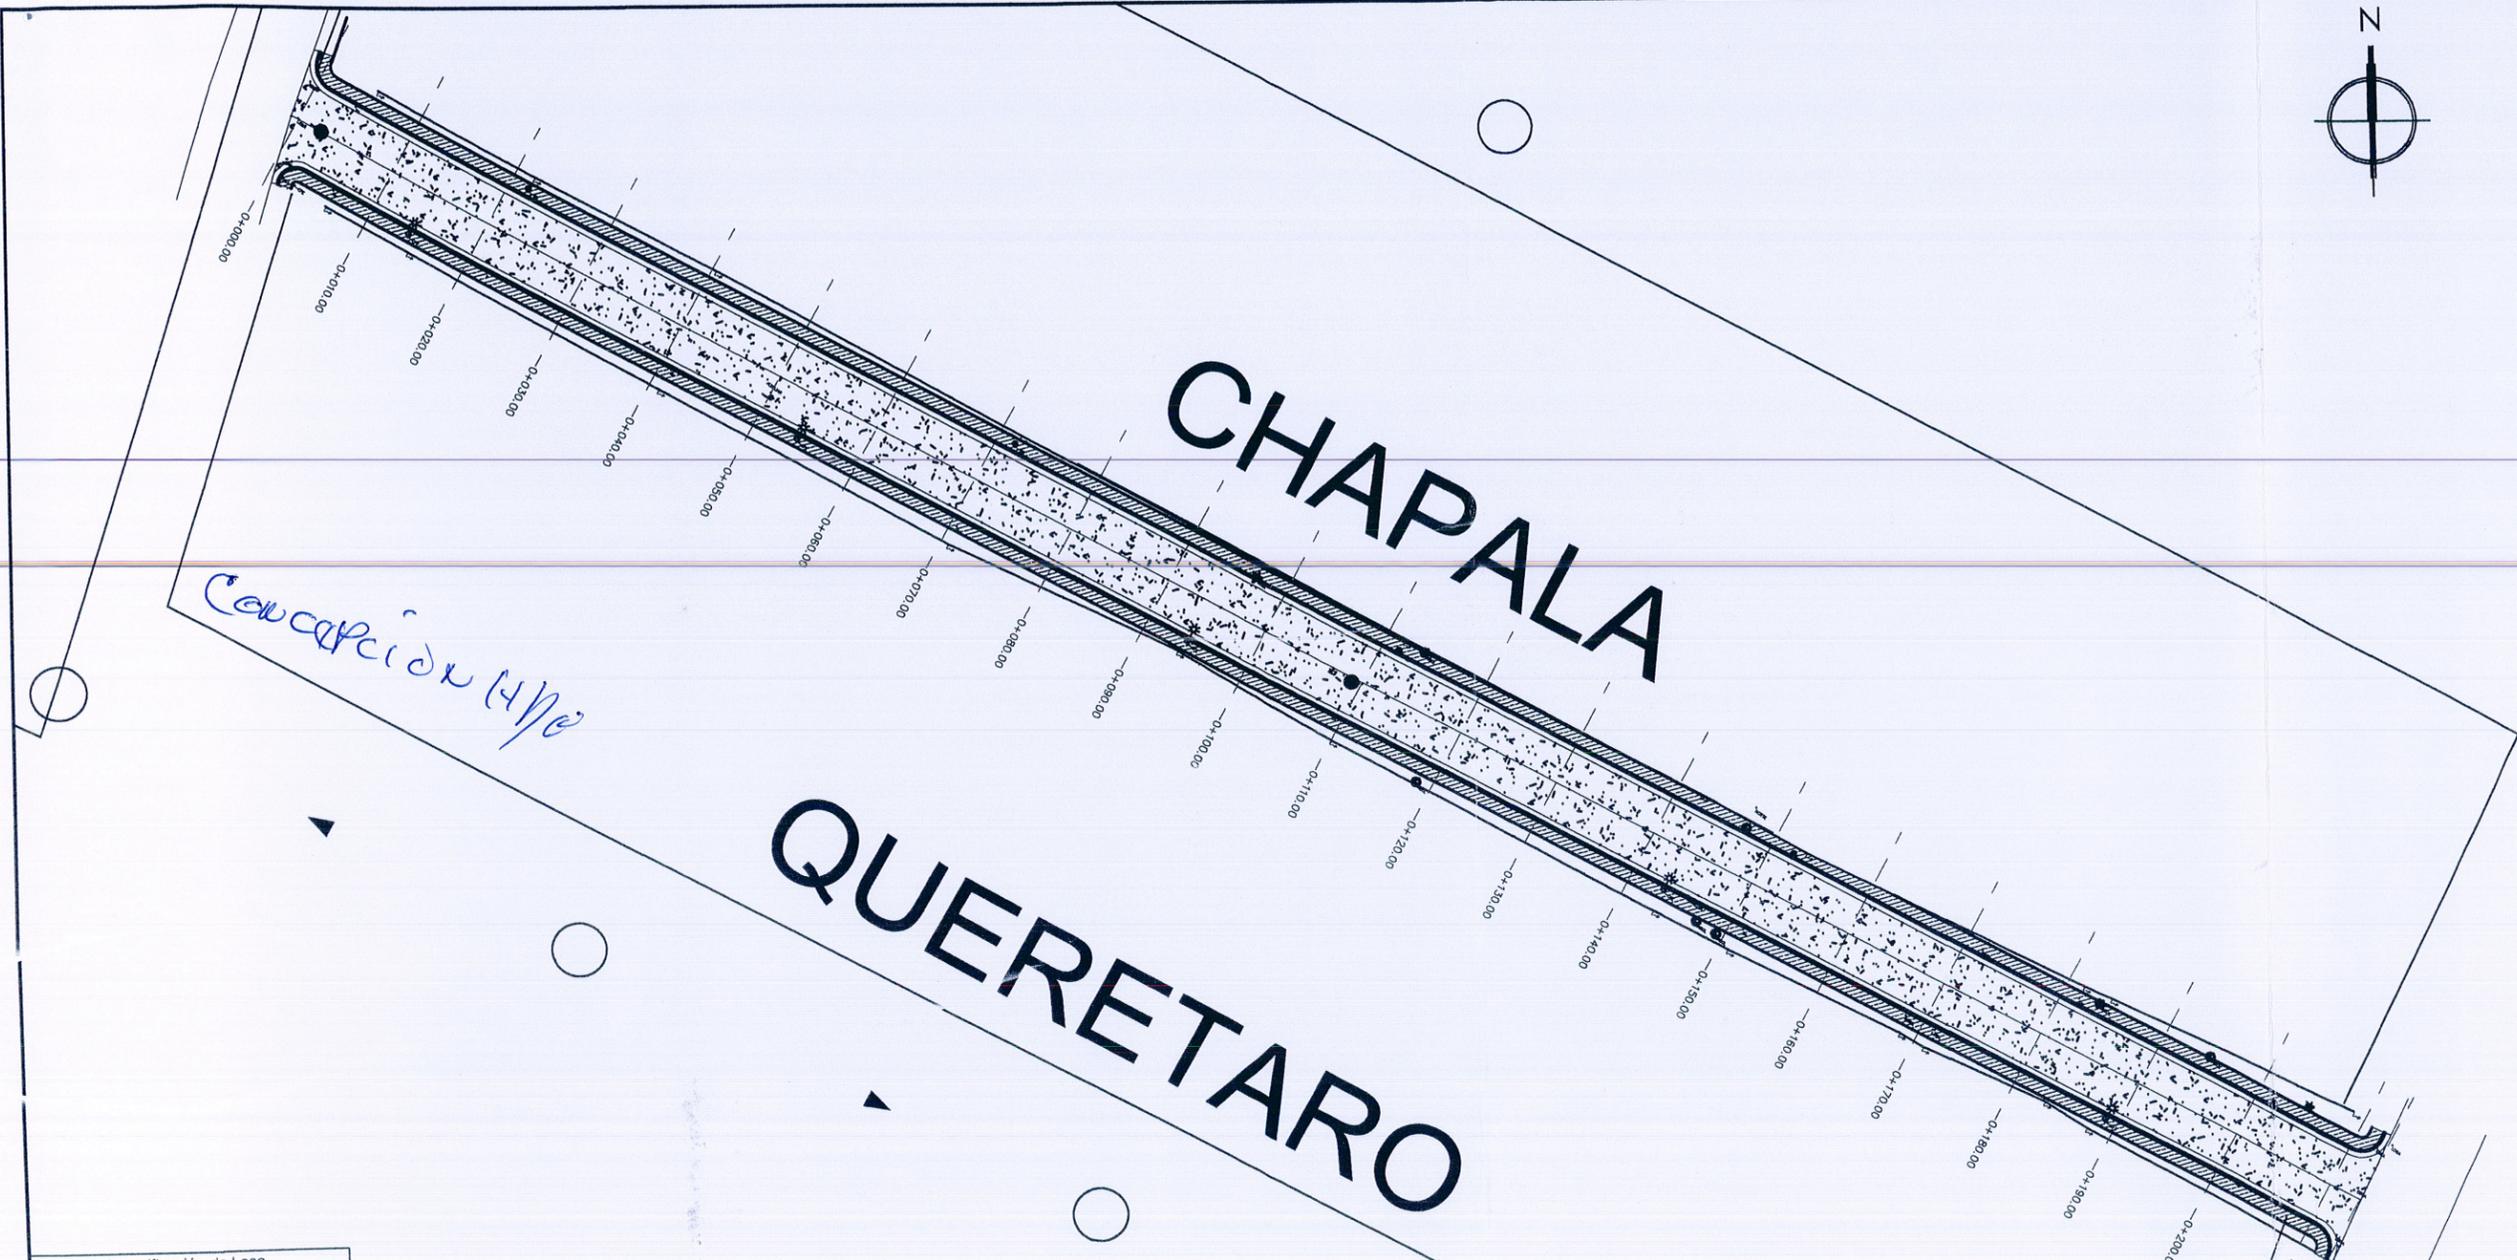

Cuantificación de Losa
AREA DE LOSA = 1409.76 M2

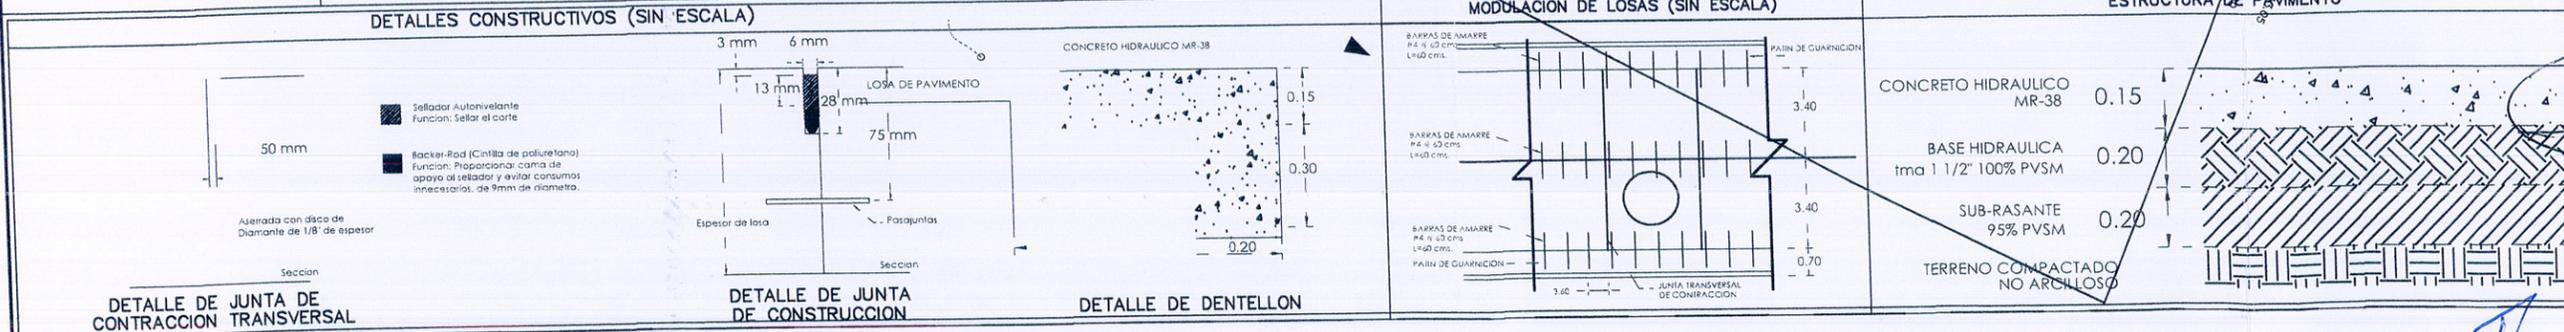

01
AQ-01

PLANTA DE LOSA EN C. CHAPALA
PLANO DE OBRA TERMINADA - LOSA

Alfredo F. C.

[Handwritten signature]

LI . ANA MARCELA GUZMÁN VALVERDE
SI DICO PROCURADOR DEL
A JNTAMIENTO DE TIJUANA
P ESENTE

U: AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
24 SEP 2019
SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
TIJUANA 2016 | 2019
26 SEP 2019
DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

"Tijuana, destino de soñadores"
130 Aniversario de Tijuana

RECIBIDO
24 SEP 2019
Plan de Desarrollo Urbano y Ecología

Por este medio reciba un cordial saludo, y al mismo tiempo me permito informarle que con fecha **Jueves 26 de septiembre del 2019** en el horario que se indica, se llevará a cabo el Acto de Entrega-Recepción respecto de los trabajos denominados:

No. C	CONTRATO	DESCRIPCION DE OBRA	HORA
DOII	1-2018-SOC-3-IS-001	"DLPE-069 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C."	08:00 HRS
DOII	1-2018-SOC-3-IS-001	"DCC-150 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C."	09:00 HRS
DOI	A-R33-2018-AD-011	"SFM-040 MEJORAMIENTO (REHABILITACIÓN) DE AULAS EN ESC. PRIM. TEPOCHCALLI, EN C. CAMINO A TENOCHTITLAN Y/O TEOTIHUACAN, ENTRE TONALA Y TAJA, COL. MARIANO MATAMOROS SUR, DELEGACIÓN LA PRESA A.I.R., TIJUANA, B.C."	11:00 HRS
DOII	1-2018-SOC-3-IS-001	"DST-148 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C."	14:00 HRS
DOII	1-2018-SOC-3-IS-001	"SI-022 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C."	15:00 HRS
DOI	V-2019-R33-LP-003	"DLP-035 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. CHAPALA, ENTRE RUTA MARIANO ABASOLO, COL. BLVR. BLAKE MORA, DELEGACIÓN LA PRESA, TIJUANA, B.C."	17:00 HRS

9
L anterior se hace de su conocimiento con el fin de que si así lo estima conveniente c
c signe al personal a efecto de que haga acto de presencia al mismo y se extiende
ir itación al comité de obra. El lugar de reunión para las obras de techos firmes será en
li delegación de cada una de las obras, para las otras será en el lugar de los trabajos.



Dependencia: D.O.I.U.M.
 Sección: Subdirección de Obra Comunitaria
 Oficio: SOC/2396/2019
 Lugar: Tijuana, B.C.
 Fecha: 23 de Septiembre del 2019

"Tijuana, destino de soñadores"
130 Aniversario de Tijuana

LIC. NORA MEZA OROZCO

AV. MARTIRES DE CHICAGO No. 503 COL. OBRERA 1ra. SECCIÓN,
 TIJUANA, B.C.

PRESENTE

Por este medio reciba un cordial saludo, y al mismo tiempo me permito informarle que con fecha **jueves 26 de septiembre del 2019** en el horario que se indica, se llevará a cabo el Acto de Entrega-Recepción respecto de los trabajos denominados:

No. DE CONTRATO	DESCRIPCION DE OBRA	HORA
DOIUM-2019-R33-LP-003	"DLP-035 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. CHAPALA, ENTRE RUTA MARIANO ABASOLO, COL. BLVR. BLAKE MORA, DELEGACIÓN LA PRESA, TIJUANA, B.C."	17:00 HRS

Lo anterior se hace de su conocimiento con el fin de que designe al personal a efecto de que haga acto de presencia al mismo en cumplimiento al artículo 69.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva prestar a la presente, me despido quedando en espera de su amable respuesta y a sus órdenes.



ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
URBANA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

ARQ. VICTOR MANUEL VALENZUELA OLIVAS



- C.c.p. Ing. Everardo Lona López. - Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología Mediante Oficio PM-189-2018 De Fecha 6/Julio/2018, Del Ayuntamiento De Tijuana.
- C.c.p. Arq. Enrique Alejandro Guevara Rosas- Subdirector de Obra Comunitaria del Ayuntamiento de Tijuana.
- C.c.p. Arq. Héctor Cortes Serrano. - Jefe Departamento Operativo De La Subdirección De Obra Comunitaria Del Ayuntamiento De Tijuana.
- C.c.p. Ing. Luis Alfonso Cisneros Flores. - supervisor de Obra Comunitaria.
- C.c.p. ARCHIVO
- VMVO/EAGR/BSFR

Recibi 24/09/2019
Nora Meza Orozco
