



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: DOIUM-R33-2019-AD-073

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 69 Y 70 DE LA "LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTO, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO:	
DC-150 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION CENTRO, EN VARIAS CALLES VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION CENTRO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	
TIPO DE LICITACION:	NUMERO DE CONTRATO:
ADJUDICACION DIRECTA	<u>DOIUM-R33-2019-AD-073</u>
FECHA DE INICIO Y TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	FECHA DE INICIO Y TERMINACION SEGÚN CONVENIO ADICIONAL:
19 DE JULIO 2019 AL 31 DE AGOSTO 2019	07 DE AGOSTO 2019 AL 10 DE OCTUBRE 2019
FUENTE DE LOS RECURSOS:	DOCUMENTO DE AUTORIZACION O APROBACION:
FONDO III RAMO 33	OFICIO DE APROBACIÓN No. PP/1208/2019 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2019
PROGRAMA:	
FISMDF	

Amalia



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: DOIUM-R33-2019-AD-073

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, LOS RESPONSABLES DE LAS ENTIDADES O SUS REPRESENTANTES, ASÍ COMO EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL MENCIONADO CONTRATO O SU REPRESENTANTE DEBIDAMENTE ACREDITADO, LOS CUALES INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL CUADRO ANTERIOR, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE ESTA ACTA Y SUS ANTEFIRMAS EN CADA UNA DE LAS PAGINAS RESTANTES.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

DC-150 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION CENTRO, EN VARIAS CALLES VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION CENTRO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.

A TECHO FIRME

Suministro e instalación de placa con Nomenclatura alusiva a Dependencias, Obra y Programa Oficial a base de Lámina de PVC de 1/8" plana, gama de colores que indique la supervisión, con grabado en impresión Directa (Según especificaciones y datos del programa) de 29 cms x 13 cms, fijada con 4 tornillos de 3/4", ubicada en lugar visible donde indique la supervisión incluye material, mano de obra e instalación. (Impresión 35 a 69 placas por hoja PVC).

1

Desmontaje y/o retiro de techumbre con o sin barrotaje existente, sin recuperación, a base de madera y/o lámina, retiro de material de impermeabilización; retiro de plafón rígido de tablaroca donde aplique. Incluye: conservación y protección de bastidor de barrotaje existente en buenas condiciones y de instalaciones, así como ventanería y loseta, cancelación de salidas de eléctricas, retiro de lámparas, retiro de escombro y madera al sitio de acopio considerando accesos disponibles, limpieza del área de trabajo, maniobras, material, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

2

Amalia



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: DOIUM-R33-2019-AD-073

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

- 3** Construcción de estructura para cubierta a base de bastidor de madera con largueros a cada 60 cm con barrote de pino de 2"x6" y tijerales de madera con barrote de pino 2"x4" a cada 120 cm. Intercalados según diseño. Incluye: Forro de triplay de pino de 5/8" (16 mm), (0 caras); Impermeabilización de superficie a base de aplicación de prefabricado "chovateck sbs" granulado blanco 3.5 mm. marca thermorock aplicado por termo fusión de fuego de soplete de gas butano o propano, sellador asfáltico base agua como tapaporo emulsionado a una sola mano de 4 m²/lt diluido con agua limpia en proporción 1:3., incluye: Todos los materiales, acarreo de materiales al sitio de la obra, salidas áreas, chaflanes, cuello de tuberías, bajantes pluviales, preparación de la superficie, todos los suministros de materiales, desperdicios, traslapes, y mano de obra y equipo requeridos para su correcta ejecución.
- 4** Suministro y colocación de Moldura perimetral en techo, tablón 1"x6"x10" madera de pino incluye: acarreo de materiales al sitio de la obra, sellador, pintura esmalte ambas caras a dos manos color que la superficie indique, cortes, desperdicios, andamios, tornillería, fijación, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta instalación.
- 5** Suministro y colocación de gotero de lámina de 2" donde se indique la supervisión. Incluye: acarreo de materiales al sitio de la obra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
- 6** Suministro y colocación de barrote 2"x6" como refuerzo de estructura en sentido que se requiera o solicite la supervisión. Incluye: acarreo de materiales al sitio de la obra, clavos, tornillos, desperdicio de madera, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
- 8** Suministro y colocación de triplay de pino de 5/8" como protección lateral de cubierta en sentido que se requiera o solicite el supervisor. Incluye: acarreo de materiales al sitio de la obra, clavos, tornillos, o cualquier tipo de fijación que sea necesario, elevaciones, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Amalia



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: DOIUM-R33-2019-AD-073

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

9 Suministro y colocación de estructura de refuerzo como auxiliar para mejorar la pendiente de techo existente, de altura terminada entre 0.40 y 0.60 cms, a base de 2 barrotes longitudinales de 2"x4" largueros, barrotes diagonales 2"x4" y barrotes verticales de 2"x4" @ 60 cms. Donde lo indique la supervisión. Incluye: acarreo de materiales al sitio de la obra, cortes, maniobras, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

EXT EXTRAORDINARIOS

EXT-01 Suministro y colocación de barrote 2"x4" como refuerzo de estructura en sentido que se requiera o solicite la supervisión. Incluye: acarreo de materiales al sitio de la obra, clavos, tornillos, desperdicio de madera, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

FIANZA DE ANTICIPO:	FIANZA POR CUMPLIMIENTO:
"CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. DE C.V." No. 2010580	"CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. DE C.V." No. 2010581
MONTO TOTAL EJERCIDO C/IVA:	FECHA DE TERMINACION REAL:
\$ 1'200,000.00 M.N.	10 DE OCTUBRE DE 2019

Amalia



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: **DOIUM-R33-2019-AD-073**

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

PAGOS EN ESTIMACIONES:	IMPORTE
ESTIMACION 1	\$ 461,330.21
ESTIMACION 2	\$ 284,883.45
ESTIMACION 3	\$ 184,518.31
ESTIMACION 4	\$ 240,874.35
ESTIMACION 5 FINIQUITO	\$ 28,393.68
	<hr/>
	\$ 1'200,000.00 M.N.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGÚN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, A FIN DE SER RECIBIDOS POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA **NO EXIME** AL CONTRATISTA SOBRE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR EN LOS TRABAJOS REALIZADOS OBJETO DE LA PRESENTE ACTA, PARA LO CUAL, DE SER NECESARIO, SE RESPONDERA A SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES MEDIANTE LA UTILIZACION DE LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS CON No. 2042778 DE **CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION S.A.** DE FECHA **02 DE DICIEMBRE DE 2019**, POR UN MONTO DE **\$ 120,000.00 M.N** (CIENTO VEINTE MIL PESOS CON 00/100 M.N).

Amalia



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: **DOIUM-R33-2019-AD-073**

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

ASISTENTES AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION Y FIRMAS:

ENTREGA

"LA CONTRATISTA"

ING. GUSTAVO IGNACIO ALVAREZ OROZCO

REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE
"LA CONTRATANTE"**

DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA
URBANA MUNICIPAL DEL H. XXIII
AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.

ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY

RECIBE

SUB-DIRECCION DE OBRA COMUNITARIA
(RAMO 33).

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON

TESTIGO

REPRESENTANTE DEL SINDICO PROCURADOR
DE H. XXIII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C

ARQ. MARIO PAUL TAMEZ
NOMBRE Y FIRMA

TESTIGO

SUPERVISOR TECNICO OBRA COMUNITARIA

ING. TERESA ISABEL SALDAÑA DE LA O.

Amalia

+

ya. +



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: DOIUM-R33-2019-AD-073

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

**TESTIGO
COMITÉ DE OBRA**

Presidente
Analetic Comacho

NOMBRE Y FIRMA

**TESTIGO
REPRESENTANTE DE LA DELEGACION CENTRO**

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA
Luis R. FARIAS SANTOS

Secretario.

+

Mra. Elena Arancaga Ramirez

Mra. Elena Arancaga
Francisca Rizo Barea.

+

[Signature]

[Signature]



DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
FONDO III, RAMO XXXIII EJERCICIO 2019

SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA

RESUMEN FINANCIERO FINAL DE OBRA

CONTRATO: DOUM-R33-2019-AD-073		No. DE OBRA: DC-150	IMPORTE DE OBRA CONTRATADA: \$ 1,200,000.00	No. DE ESTIMACION: 5 (CINCO) FINIQUITO
NOMBRE DE LA OBRA: DC-150 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION CENTRO, EN VARIAS CALLES VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION CENTRO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.		FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO DEL 2019	FECHA DE TERMINACION: 10 DE OCTUBRE DEL 2019	INICIO DEL PERIODO: 09 DE OCTUBRE DE 2019
CONTRATISTA: ING. GUSTAVO IGNACIO ALVAREZ OROZCO		LUGAR: TIJUANA, B.C.	PROGRAMA: FONDO III, RAMO 33	TERMINO DEL PERIODO: 10 DE OCTUBRE DE 2019
				FECHA DE ELABORACION: 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	METAS EJECUTADAS																													
					PERIODO DEL 07 DE AGO AL 21 DE AGO 2019			PERIODO DEL 30 DE AGO AL 19 DE SEP 2019			PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2019			PERIODO DEL 18 DE SEP AL 05 DE OCT 2019			PERIODO DEL 06 DE OCT AL 03 DE OCT 2019			PERIODO DEL 04 DE OCT AL 10 DE OCT 2019														
					CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE												
1	PZA	22.00	\$ 41.45	\$ 911.90	6.00	\$ 41.45	\$ 248.70	7.00	\$ 41.45	\$ 290.15	13.00	\$ 41.45	\$ 538.85	6.00	\$ 41.45	\$ -	0.00	\$ 41.45	\$ -	0.00	\$ 41.45	\$ -	13.00	\$ 41.45	\$ 538.85									
2	M2	358.56	\$ 64.23	\$ 23,026.46	358.56	\$ 64.23	\$ 23,026.46	0.00	\$ 64.23	\$ -	1,054,623.9	\$ 64.23	\$ 67,738.40	481,540.40	\$ 64.23	\$ 30,923.34	214,661.89	\$ 64.23	\$ 13,762.60	0.00	\$ 64.23	\$ -	1,054,623.9	\$ 64.23	\$ 67,738.40									
3	M2	717.00	\$ 837.65	\$ 600,738.45	427.62	\$ 837.65	\$ 358,196.79	289.48	\$ 837.65	\$ 242,540.82	1,058.00	\$ 837.65	\$ 886,445.30	187.00	\$ 837.65	\$ 159,920.95	174.00	\$ 837.65	\$ 145,766.74	0.00	\$ 837.65	\$ -	1,058.00	\$ 837.65	\$ 886,445.30									
4	ML	220.00	\$ 148.47	\$ 32,663.40	206.64	\$ 148.47	\$ 30,679.84	13.36	\$ 148.47	\$ 1,983.56	515.09	\$ 148.47	\$ 76,475.41	0.00	\$ 148.47	\$ -	295.09	\$ 148.47	\$ 43,512.01	0.00	\$ 148.47	\$ -	515.09	\$ 148.47	\$ 76,475.41									
5	ML	220.00	\$ 43.36	\$ 9,539.20	206.640	\$ 43.36	\$ 8,959.91	13.360	\$ 43.36	\$ 579.29	515.09	\$ 43.36	\$ 22,334.30	0.00	\$ 43.36	\$ -	295.09	\$ 43.36	\$ 12,795.10	0.00	\$ 43.36	\$ -	515.09	\$ 43.36	\$ 22,334.30									
6	ML	840.00	\$ 89.66	\$ 75,314.40	0.000	\$ 89.66	\$ -	166.630	\$ 89.66	\$ 14,940.05	280.88	\$ 89.66	\$ 23,390.50	0.00	\$ 89.66	\$ -	0.00	\$ 89.66	\$ -	14.25	\$ 89.66	\$ 1,280.45	280.88	\$ 89.66	\$ 23,390.50									
7	ML	715.00	\$ 97.66	\$ 69,984.20	0.000	\$ 97.66	\$ -	0.000	\$ 97.66	\$ -	-	\$ 97.66	\$ -	0.00	\$ 97.66	\$ -	0.00	\$ 97.66	\$ -	0.00	\$ 97.66	\$ -	0.00	\$ 97.66	\$ -									
8	M2	180.37	\$ 252.35	\$ 45,516.37	7.73	\$ 252.35	\$ 1,951.42	19.660	\$ 252.35	\$ 3,447.10	21.39	\$ 252.35	\$ 5,397.77	0.00	\$ 252.35	\$ -	0.00	\$ 252.35	\$ 0.75	0.00	\$ 252.35	\$ -	21.39	\$ 252.35	\$ 5,397.77									
9	ML	13.76	\$ 297.78	\$ 4,094.48	0.00	\$ 297.78	\$ -	0.00	\$ 297.78	\$ -	73.66	\$ 297.78	\$ 21,934.47	0.00	\$ 297.78	\$ -	0.0000	\$ 297.78	\$ -	69.81	\$ 297.78	\$ 17,839.99	73.66	\$ 297.78	\$ 21,934.47									
EXT-01	ML	0.00	\$ 58.77	\$ -	0.00	\$ 58.77	\$ -	0.00	\$ 58.77	\$ -	116.66	\$ 58.77	\$ 6,856.11	0.00	\$ 58.77	\$ -	116.66	\$ 58.77	\$ 6,856.11	0.00	\$ 58.77	\$ -	116.66	\$ 58.77	\$ 6,856.11									
SUBTOTAL				\$ 861,788.06	SUBTOTAL				\$ 427,157.60	SUBTOTAL				\$ 263,780.97	SUBTOTAL				\$ 1,111,111.11	SUBTOTAL				\$ 223,031.81	SUBTOTAL				\$ 26,290.44	SUBTOTAL				\$ 1,111,111.11
IVA				\$ 68,943.11	IVA				\$ 34,172.61	IVA				\$ 13,668.02	IVA				\$ 68,888.89	IVA				\$ 2,103.24	IVA				\$ 88,888.89					
TOTAL				\$ 930,731.97	TOTAL				\$ 461,330.21	TOTAL				\$ 284,883.45	TOTAL				\$ 1,200,000.00	TOTAL				\$ 184,518.31	TOTAL				\$ 240,874.35	TOTAL				\$ 1,200,000.00

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO	\$ 930,731.97	TOTAL EJERCIDO	\$ 461,330.21	TOTAL EJERCIDO	\$ 284,883.45	TOTAL EJERCIDO	\$ 184,518.31	TOTAL EJERCIDO	\$ 240,874.35	TOTAL EJERCIDO	\$ 1,200,000.00
AMPLIACIONES AUTORIZADAS CONVENIO ADICIONAL	\$ 444,659.77	TOTAL EJERCIDO	\$ 461,330.21	TOTAL EJERCIDO	\$ 284,883.45	TOTAL EJERCIDO	\$ 184,518.31	TOTAL EJERCIDO	\$ 240,874.35	TOTAL EJERCIDO	\$ 1,200,000.00
REDUCCIONES AUTORIZADAS CONVENIO ADICIONAL	\$ 175,391.74	POR EJERCER	\$ 469,401.76	POR EJERCER	\$ 184,518.31	POR EJERCER	\$ 184,518.31	POR EJERCER	\$ 240,874.35	POR EJERCER	\$ 1,200,000.00
IMPORTE FINAL DE OBRA	\$ 1,200,000.00	TOTAL AMORTIZADO	\$ 138,399.06	TOTAL AMORTIZADO	\$ 85,465.04	TOTAL AMORTIZADO	\$ 55,355.49	TOTAL AMORTIZADO	\$ 279,219.59	TOTAL AMORTIZADO	\$ 279,219.59
ANTICIPO DE OBRA	\$ 279,219.59	POR AMORTIZAR	\$ 140,810.53	POR AMORTIZAR	\$ 55,355.49	POR AMORTIZAR	\$ 55,355.49	POR AMORTIZAR	\$ 279,219.59	POR AMORTIZAR	\$ 279,219.59
SALDO SIN EJERCER	\$ -	AVANCE	\$ 49.57%	AVANCE	\$ 80.17%	AVANCE	\$ 77.56%	AVANCE	\$ 97.63%	AVANCE	\$ 100.00%

ELABORO EL CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL: ING. GUSTAVO IGNACIO ALVAREZ OROZCO


VALIDO SUPERVISOR O D O I U M: ING. TERESA ISABEL SALDAÑA DE LA O

Vo Bo JEFE DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA: ARO. RAFAEL SANCHEZ GONZALEZ


Vo Bo SUBDIRECTOR DE OBRA COMUNITARIA DOUM: ARO. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON

AUTORIZO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL: ARO. JAVIER DELGADO GARCIA


DC-150-05 VALLE OSUNA
TOMAS HUMBERTO
47.18 M2

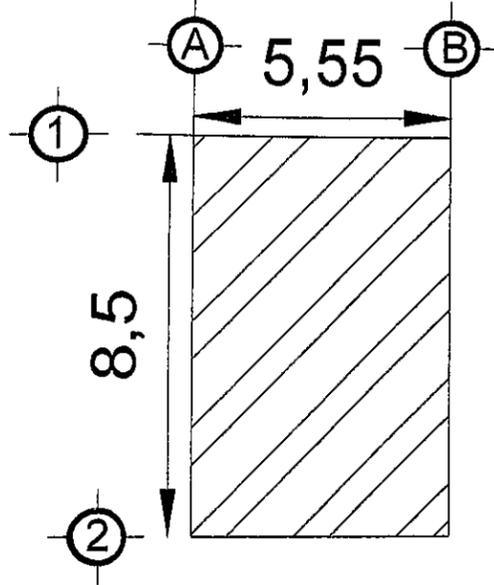


DC-150-13 SANCHEZ MEDINA
ELIZABETH
40.45 M2

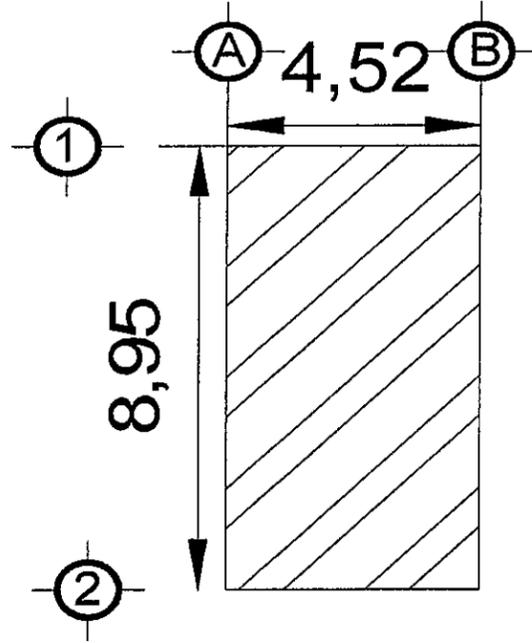


DC-150-14 LARRAÑAGA
RAMIREZ MA. ELENA
125.84 M2

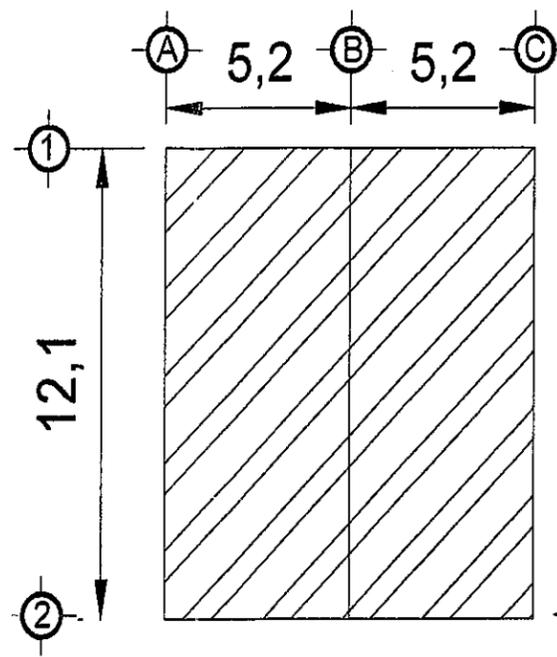


DC-150-16 BUSTOS
HERNANDEZ RICARDO
74.73 M2

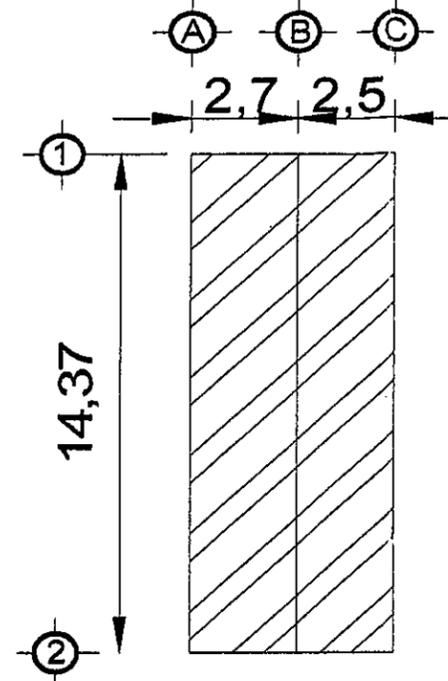


DC-150-20 GUZMAN GRIMALDO
MARIA DE JESUS
87.89 M2

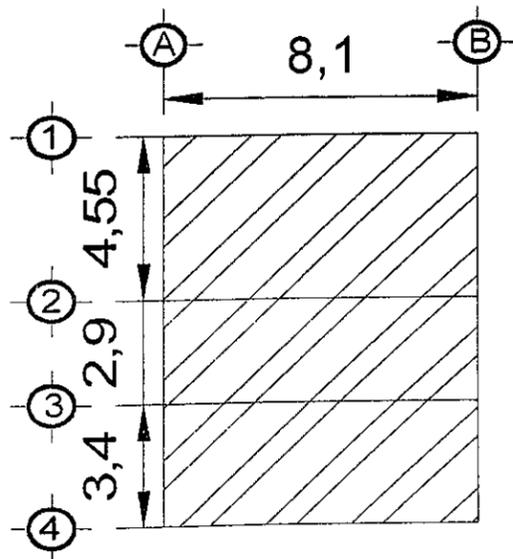

DC-150-24 GODINEZ
CEBALLOS MARIA MELANIA
85.31 M2

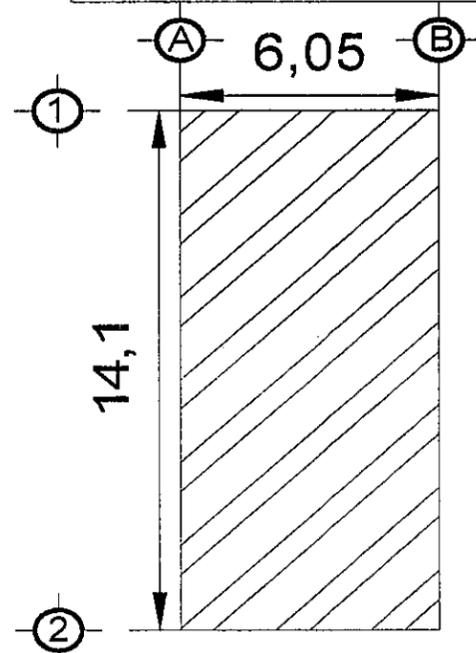

DC-150-30 HERRERA TEJEDA
MARGARITA
94.80 M2

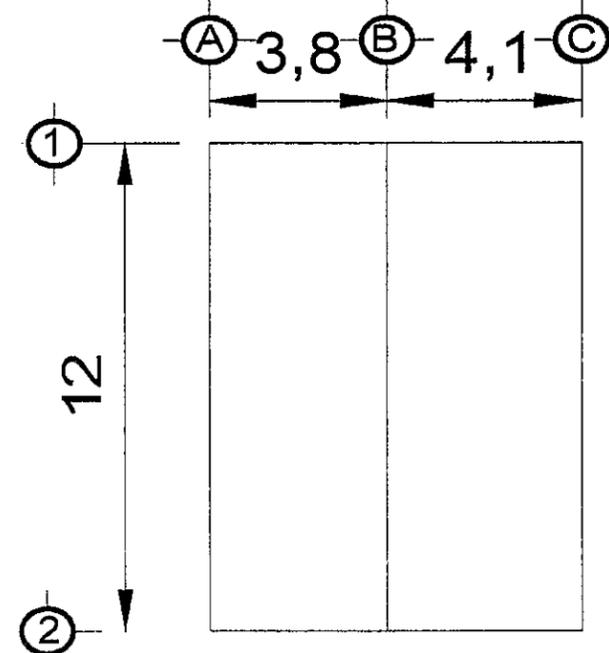

DC-150

PLANO DE OBRA
TERMINADA

PLANO DE CONJUNTO

CONTRATISTA:

Gustavo Alvarez Orozco
ING. GUSTAVO IGNACIO
ALVAREZ OROZCO

CANTIDADES DE OBRA:

NO.	CONCEPTO	CANT.	UNID.
1.	PLACA	13	PZA
2.	DESMONTAJE	1080.48	M2
3.	CONSTRUCCION	1080.48	M2
4.	MOLDURA	828.45	ML
5.	GOTERO 2"	828.45	ML

OBRA:

CONSTRUCCION DE TECHOS
FIRMES EN VARIAS COLONIAS
DE LA DELEGACION CENTRO, EN
VARIAS CALLES VARIAS
COLONIAS DE LA DELEGACION
CENTRO, EN LA CIUDAD DE
TIJUANA, B.C.


ESCALA:
SIN ESCALA

PLANO:


ACOTAMIENTO:
METROS

1/2


DC-150-32 RAMIREZ WALKER
GUADALUPE
85.18 M2

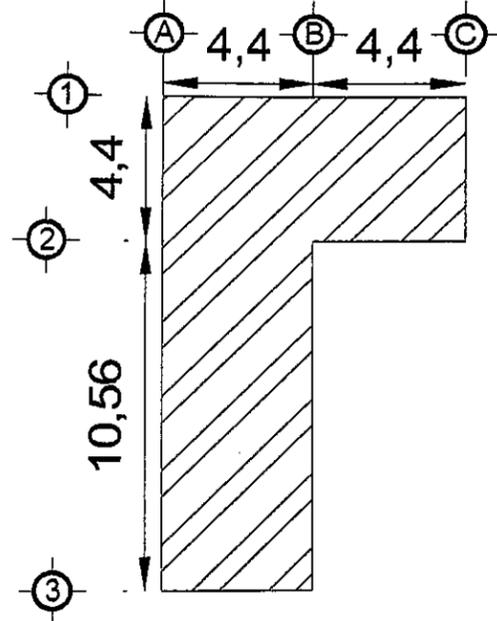


DC-150-33 VALDEZ SANTILLAN
CONSUELO
94.80 M2

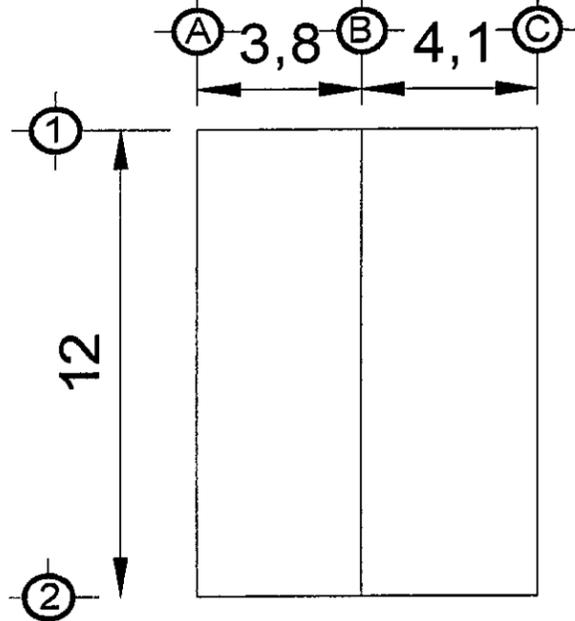


DC-150-34 PUGA BAEZA
FRANCISCA
86.29 M2

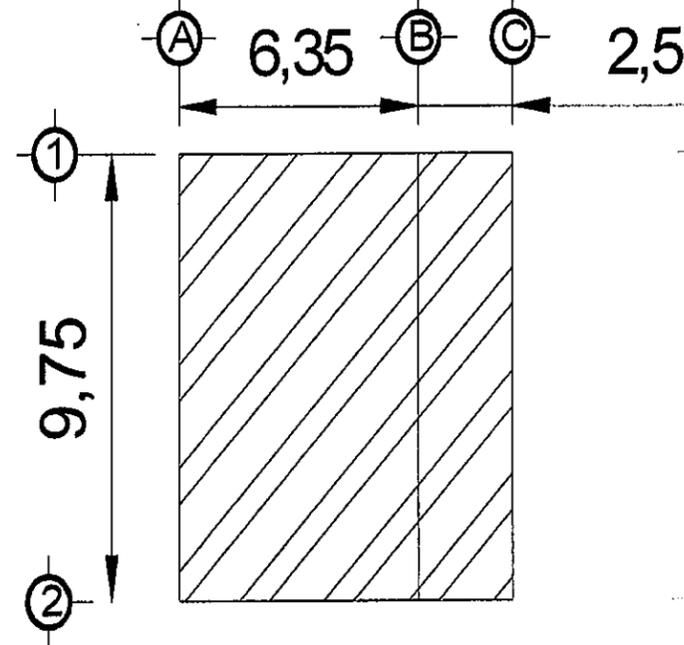


DC-150-35 HERRADA LOZADA
SILVIA
75.78 M2

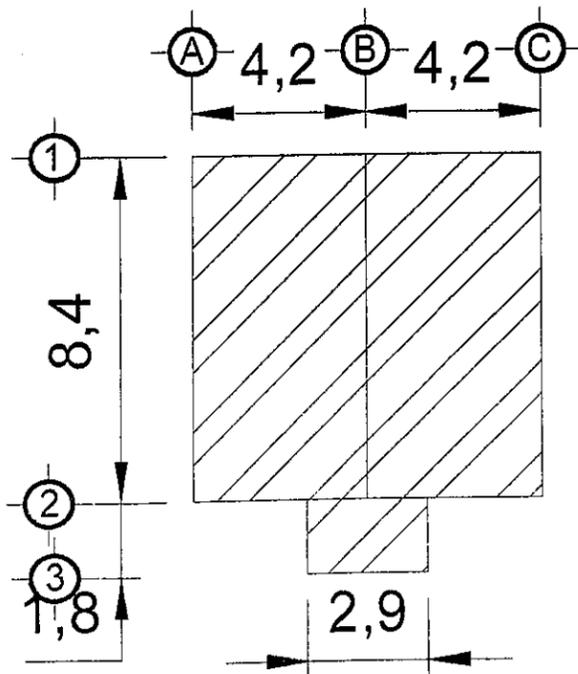

DC-150-38 RAMIREZ ROSALES
MARTHA
86.15 M2

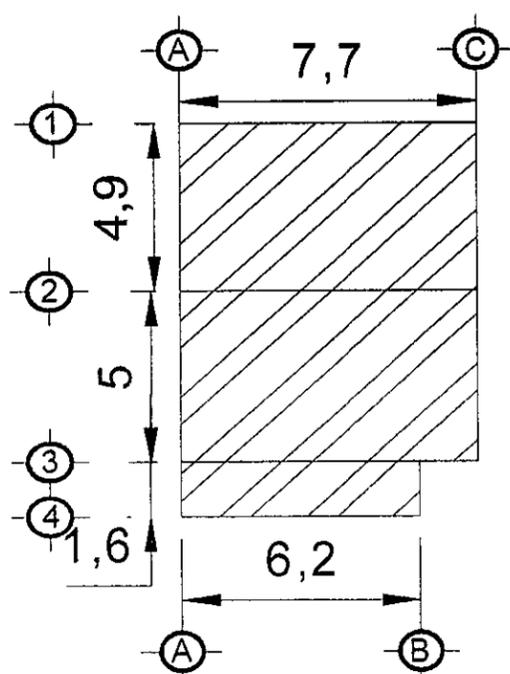

DC-150-39 REBOLLO REYES
REYNALDA
96.08 M2

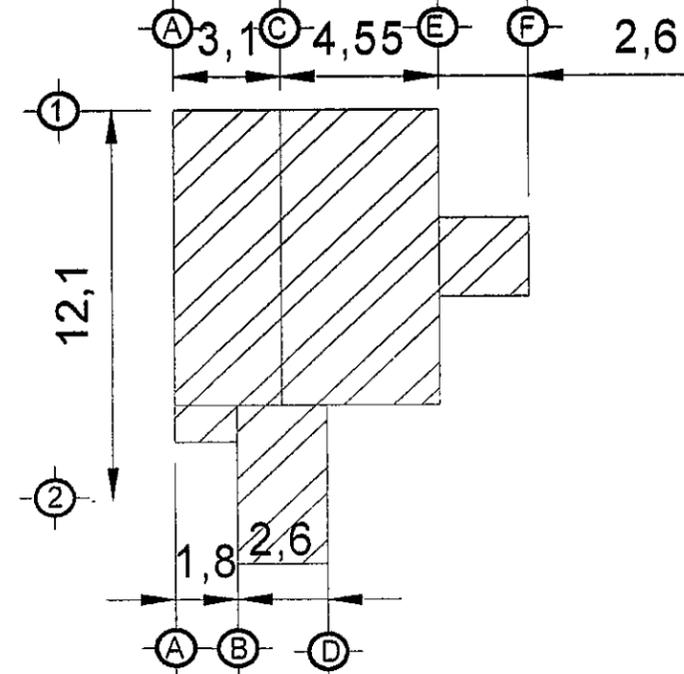

DC-150

PLANO DE OBRA
TERMINADA

PLANO DE CONJUNTO

CONTRATISTA:

Gustavo Alvarez Orozco
ING. GUSTAVO IGNACIO
ALVAREZ OROZCO

CANTIDADES DE OBRA:

NO. CONCEPTO	CANT. UNID.
1. PLACA	13 PZA
2. DESMONTAJE	1080.46 M2
3. CONSTRUCCION	1080.46 M2
4. MOLDURA	528.45 ML
5. GOTERO 2"	528.45 ML

OBRA:

CONSTRUCCION DE TECHOS
FIRMES EN VARIAS COLONIAS
DE LA DELEGACION CENTRO, EN
VARIAS CALLES VARIAS
COLONIAS DE LA DELEGACION
CENTRO, EN LA CIUDAD DE
TUJANA, B.C.

ESCALA:
SIN ESCALA

PLANO:

ACOTAMIENTO:
METROS

2/2



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

Dependencia: D.O.I.U.M.
 Sección: Subdirección de obra comunitaria
 Número de Oficio: SOC-XXIII-0476-2019
 Expediente: N/A
 Asunto: Invitación para acta de entrega-recepción.

Tijuana, Baja California a 04 de diciembre de 2019

ING. GUSTAVO IGNACIO ÁLVAREZ OROZCO
 CALLE ALMADA No. 1245, COL. INDEPENDENCIA
 TIJUANA, B.C.
PRESENTE

Por este medio reciba un cordial saludo, y al mismo tiempo me permito informarle que con fecha **Lunes 09 de Diciembre del 2019** en el horario que se indica, se llevará a cabo el Acto de Entrega-Recepción respecto de los trabajos denominados:

No. DE CONTRATO	DESCRIPCION DE OBRA	HORA
DOIUM-R33-2019-AD-073	"DC-150 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN CENTRO, EN VARIAS CALLES VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN CENTRO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C."	11:00 HRS

Lo anterior se hace de su conocimiento con el fin de que designe al personal a efecto de que haga acto de presencia al mismo en cumplimiento al artículo 69.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva prestar a la presente, me despido quedando en espera de su amable respuesta y a sus órdenes.

ATENTAMENTE
SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA
 04 DIC 2019
DES-PACHADO
 SUBDIRECCIÓN DE OBRA
JOSE MANUEL QUINTANA ROLON
 DOIUM

PRESENTE ORIGINAL OROZCO 4-12-19

C.c.p. Mdu. Arq. Patricia Peterson Villalobos. - Secretaria De Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental del Ayuntamiento De Tijuana.
 C.c.p. Arq. Javier Delgado Garibay. - Dirección de Obra e Infraestructura Urbana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana.
 C.c.p. - Archivo Dirección
 Expediente. JDG/JMQR/BSFR
